


वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

(Annual Progress Report)

आ.व. २०८२/०८३



गंगादेव गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सानडाँडा, रोल्पा

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

धन्यवाद मन्तव्य

गंगादेव गाउँपालिकाले अंगीकार गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासमा दिगो लक्ष्य हाँसिल गर्न विकासका योजना, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष सबल हुन जरुरी छ । छोटो समयमावधिमा विकासका लक्ष्यहरु हाँसिल गर्न तथ्यमा आधारित नीति, योजना र कार्यक्रम तय गर्नु जरुरी भईसकेको छ । योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र तथ्यमा आधारित नीति निर्माणको लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । वर्तमान सङ्घीय संरचना अनुरूप गाउँपालिकाको विभिन्न तहमा हुने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धतिलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको छ । गाउँपालिकाको आवधिक विकास योजनाको लक्ष्यले तोकेको परिणाम प्राप्त गर्नको लागि समेत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा थप सुधार र परिमार्जन गर्न यस प्रतिवेदनले सघाउ पुऱ्याउनेछ । प्रस्तुत सन्दर्भमा तयार भएको अनुगमन प्रतिवेदनले गाउँपालिका लगायतका निकायलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यमा ठोस मार्गदर्शन प्रदान गर्ने तथा भावी दिनहरुमा तर्जुमा गरिने योजनाको लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति तयार गर्नको लागि आधार तयार गर्नेछ । साथै यस प्रतिवेदनले सङ्घीय तहको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाई विकास कार्यक्रम/आयोजनाहरुको अनुगमनको पनि अनुगमन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउनेछ । यस प्रतिवेदनको कार्यान्वयन पक्षको प्रभावकारी अनुगमन गाउँ कार्यपालिकाले नै गर्नेछ । साथै यस प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु ।

अमृता कुमारी के सी
उपाध्यक्ष

विषय सूचि

गंगादेव गाउँपालिकाको परिचय	१
गाउँपालिकाको स्वरूप र प्रकृति	१
क. पालिकाको नक्सा	२
ख. संगठन संरचना	२
गाउँपालिकाका शाखा र जिम्मेवार अधिकारी	३
योजना तथा अनुगमन शाखा	४
आर्थिक प्रशासन शाखा	३१
राजस्व प्रशासन शाखा	३४
कृषि विकास शाखा	३५
पशु सेवा शाखा	३८
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा	३९
रोजगार सेवा केन्द्र	४१
स्वास्थ्य शाखा	४६
उद्योग विकाश शाखा	५२
वडा गत प्रगति	५३
वडा नं. ६ को कार्यालय	५३
वडा नं. ३ को कार्यालय	५५

गंगादेव गाउँपालिकाको परिचय

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २९५ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएका गाउँपालिका, नगरपालिका मिति २०७३/११/२७ देखि लागू हुने गरि ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ वटा नगरपालिका, ४६० वटा गाउँपालिका गरि जम्मा ७५३ वटा स्थानीय तह कायम भएको हो । जनताको अधिकार जनताकै घरदैलोमा पगेको छ । सोही व्यवस्था अनुरूप यस गंगादेव गाउँपालिकाको स्थापना भएको हो ।

गंगादेव गाउँपालिका लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रोल्पा जिल्लाको साविकको ४ वटा गा.वि.स. ओत, जिनावाड, पाखापानी र राँक मिलेर बनेको एक गाउँपालिका हो । यस गाउँपालिकाको जम्मा जनसंख्या २१,५०३ रहेको छ । जसमा १०,०४५ पुरुष र ११,४५८ महिला रहेका छन् । ४,४३३ घरधुरी समावेश रहेको यस पालिकाको क्षेत्रफल १२४.३८ वर्ग कि.मि. रहेको छ । यस गाउँपालिकाको पूर्वमा माडी र परिवर्तन गाउँपालिका, पश्चिममा सल्यान बागचौर न.पा र छत्रेश्वरी गाउँपालिका, उत्तरमा रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका, दक्षिणमा त्रिवेणी । माडी, गाउँपालिका रहेका छन् । यस गाउँपालिकामा जम्मा ७ वटा वडाहरू रहेका छन् जसमा सुखाओडार बजार, राँक ताप्ला, डलसिंगे, ओत, नाउली, झ्याम बजार बजार उन्मुख क्षेत्र पर्दछन् ।

कार्यालयको नाम: गंगादेव गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ।


ठेगाना: सानडाँडा रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल ।

गंगादेव गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण


क्र.सं.	नयाँ वडा	समावेश गाविस / नगरपालिका	जनसंख्या	क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)
१	१	ओत(१,२,६,७)	२२४३	१४.०८
२	२	जिनावाड (१,२,७,८) ओत (८,९)	२९०८	१४.७२
३	३	जिनावाड(३-६,९)	३१३७	२९.७३
४	४	पाखापानी(१,२,७-९)	३६४४	१४.६५
५	५	पाखापानी(३-६)	३३४१	२०.०८
६	६	राँक(१-३,६,७)	३७०३	१७.३४
७	७	राँक(४,५,८,९)	२५२७	१३.७८
	जम्मा		२१५०३	१२४.३८

गाउँपालिकाको स्वरूप र प्रकृति

क. पालिकाको नक्सा

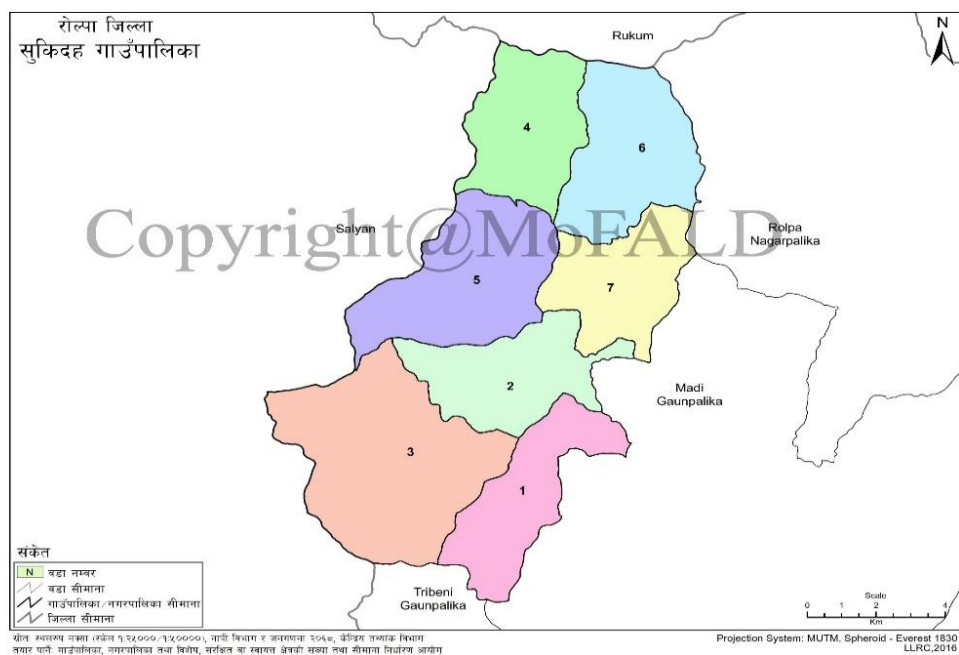

ख. संगठन संरचना



गाउँपालिकाका शाखा र जिम्मेवार अधिकारी

गंगादेव गाउँपालिकाको कार्यक्षेत्र भित्र समाहित गरिएको विभिन्न क्रियाकलापहरु संचालन गर्न देहाय बमोजिमका शाखा, कार्यक्रम तथा वडा कार्यालयको को व्यवस्था गरिएको छ ।

क्र.सं	नामथर	पद	तह	जिम्मेवारी
१	याम बहादुर बुढा मगर	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	रा.प तृतीय	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
२	सकलदेव यादव	ज.स्वा.अधिकृत	सातौ	स्वास्थ्य शाखा प्रमुख
३	तिलक केसी	सुचना प्रविधि अधिकृत	सातौ	सुचना प्रविधि /सहकारी शाखा
४	खिमा कुमारी पाण्डे	रोजगार संयोजक	छैठौ	रोजगार सेवा केन्द्र प्रमुख
५	विक्रम हमाल	इन्जिनियर	छैठौ	प्राविधिक शाखा प्रमुख
६	उदय प्रकाश वली	स.आलेप अधिकृत	छैठौ	आलेप शाखा
७	कुल बहादुर योगी	स.प्रशासकीय अधिकृत	छैठौ	प्रशासन शाखा प्रमुख
८	प्रेम खत्री	स.लेखा अधिकृत	छैठौ	आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख
९	तुलाधर शर्मा	स.प्रशासकीय अधिकृत	छैठौ	राजस्व शाखा, कानून ईकाई प्रमुख
१०	अंग बहादुर वली	स. शिक्षा अधिकृत	छैठौ	शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा
११	कमलराज पुन	प.स्वा. प्राविधिक	पाँचौ	पशु सेवा शाखा प्रमुख
१२	सुवास खड्का	प्राविधिक सहायक(कृषि)	पाँचौ	कृषि विकास शाखा प्रमुख
१३	सनत कुमार ढकाल	प.स्वा. प्राविधिक	पाँचौ	योजना शाखा प्रमुख
१४	तिर्थराज वली	एमआईएस अपरेटर	पाँचौ	पञ्जिकरण शाखा प्रमुख
१५	पवन कुमार पुन	अ.सव.ईन्जिनियर	चौथो	स्टोर शाखा प्रमुख
१६	सुभद्रा वली	सहायक चौथो	चौथो	महिला बालबालिका शाखा प्रमुख
१७	अनिता घर्ति	पोषण सहजकर्ता	चौथो	बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम संयोजक
१८	ऋषिराज शर्मा	उद्यम विकास सहजकर्ता	चौथो	उद्योग विकास शाखा प्रमुख

वडा कार्यालय				
१	१ नं वडा कार्यालय	वडा सचिव	श्री त्रिभुवन सिंह घर्ती	९८५१२१११०२
२	२ नं वडा कार्यालय	वडा सचिव	श्री दोर्ण बहादुर डाँगी	९८४४९८४३८१
३	३ नं वडा कार्यालय	वडा सचिव	श्री धन बहादुर डाँगी	९८४४९७२६१५
४	४ नं वडा कार्यालय	वडा सचिव	श्री नरेश खड्का	९८४४८३१३२८
५	५ नं वडा कार्यालय	वडा सचिव	श्री किरण के सी	९८६६७४०२२६
६	६ नं वडा कार्यालय	वडा सचिव	श्री ध्रुव केसी	९८४९८९०५५८
७	७ नं वडा कार्यालय	वडा सचिव	श्री देवराज वली	९८४७९८४४३३

योजना तथा अनुगमन शाखा

भाग १ : परिचय

१.१ पृष्ठभूमि

योजना, नीति कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा लगानी तथा स्रोत साधनको प्रवाह समुचित ढंगले भएको छ कि छैन र कार्य तालिका अनुसार क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयन भई लक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको छ छैन भनी विभिन्न तहका व्यवस्थापन वा व्यवस्थापनले तोकेका व्यक्ति तथा निकायबाट निरन्तर र आवाधिक रूपमा निगरानी राख्ने कार्यलाई अनुगमन भनिन्छ । विकास योजना नीति कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । विकासमा गरिएको लगानीमा प्रतिफल मापन गर्ने र सेवाग्राहीको जीवनस्तरमा त्यसले पारेको असर तथा प्रभाव आंकलन गरी उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न यसको थप महत्त्व रहन्छ । विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै भावी नीति तथा कार्यक्रमलाई तथ्यपरक र नतिजामुखी बनाउन यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्दछ । नतिजामुखी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन, २०७० जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि सङ्घ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भएको पुनः संरचना अनुरूप स्थानीय तहमा सञ्चालित योजना तथा परियोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन यसको सफल अभ्यास हुँदै आइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा गंगादेव गाउँपालिकाले पनि योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसै कार्यविधिमा योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पश्चात अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यपालिका बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान भए बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको अपरिहार्यता प्रष्ट झल्किन्छ । तसर्थ यस प्रतिवेदनमा अनुगमन गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि तथा प्रक्रिया सूचक तथा सूचनाका स्रोतहरू संस्थागत व्यवस्था र सूचनाको प्रयोग सम्बन्धी विषयलाई समेटेको छ । प्रतिवेदन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन यसलाई सहभागितामूलक बनाउन आवश्यक छ । गाउँपालिकाको विकास सम्बन्धी नीति योजना कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न प्रतिफल तथा प्रभावको विश्वसनीय र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको विकास गरी तिनलाई गाउँपालिकाका विभिन्न तहहरूमा लागु गरी संस्थागत गर्न मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गरी विषय क्षेत्रगत नीतिहरू र प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम तथा

आयोजनाहरूको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न गराउन र सोको आधारमा गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यान्वयनमा सुधार गर्नुका साथै अनुभवको आदान प्रदान गरी विशेषज्ञताको विकास समेत गर्ने उद्देश्य लिई यो प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।

१.२ अनुगमनको उद्देश्य

अनुगमनले संचालित योजना आयोजना तथा क्रियाकलापहरूलाई व्यवस्थित सरल नतिजामूलक विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाई नीति निर्णय प्रक्रियालाई तथ्यपरक बनाउनुका साथै पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्ने मूल उद्देश्य लिएको छ ।

उपरोक्त उद्देश्यहरूका साथै अनुगमनका निम्न उद्देश्यहरू रहेका छन् ।

- ✓ कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयन चरणमा लगानी क्रियाकलाप प्रक्रिया र प्रतिफल सूचकहरूको आधारमा कार्य सम्पादन भए नभएको निर्धारण गर्न ।
- ✓ कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयन चरण सम्पन्न भएपछि उक्त कार्यक्रम/आयोजनाको निर्धारित आयुसम्म निरन्तर सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन तथा मर्मत-सम्भार निश्चित गर्न ।
- ✓ कार्यक्रम/आयोजनाको आवश्यकता तथा सुनिश्चितता निर्धारण गर्न कार्यक्रम/आयोजनाको पूर्ण विवरण स्पष्ट गर्न सूचकहरू निर्धारण गर्न ।
- ✓ कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयनको प्रगतिको समीक्षा गर्न पूर्वनिर्धारित कार्ययोजनामा परिमार्जन गर्न वा सञ्चालन ढाँचामा आवश्यक परिवर्तन गर्न ।
- ✓ कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयनको कार्यक्षमता, प्रभावकारीता र दिगोपनालाई ध्यानमा राखेर समीक्षा गर्न र कार्यक्रम/आयोजना सम्पन्न भएपछि थप कार्य (Follow-up) आवश्यक रहेको वा नरहेको निक्यौल गर्न ।
- ✓ संचालित कार्यक्रम/आयोजनाको प्रभाव र दिगोपनालाई ध्यानमा राखेर समीक्षा गर्न, भविष्यमा कार्यक्रम/आयोजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा सुधार गर्नका लागि सिकाइ र सुझावहरू प्राप्त गर्न ।
- ✓ योजना कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा गरिने अनुगमन र मूल्याङ्कनबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई उचित समयमा सम्बोधन गर्न ।

१.३ अनुगमनको ढाँचा एवं विधि

आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउन सेवा प्रदायक र सेग्राहीको सहभागितामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । सहभागितामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कनले संस्थागत सिकाइ अभिवृद्धि गर्ने, सरोकारवालाको धारणा बुझी आयोजनामा सुधार गर्ने र प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक उत्तरदायित्व वा जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने गर्दछ । साथै यसबाट सरोकारवालालाई आयोजनाको अवस्थाको जानकारी हुन गई समयमै प्रतिफल प्राप्तिसा सहयोग पुग्ने हुन्छ । तसर्थ गंगादेव गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिले गाउँपालिका, वडा र अन्य निकायहरूबाट सञ्चालित क्रियाकलाप, आयोजना र योजनाको अनुगमनका लागि विभिन्न ढाँचा एवं विधिहरू प्रयोग गर्दै आइरहेको छ ।

विकास आयोजनाहरूको प्रगति विवरण वा सूचनाका आधारमा गरिने समिक्षा अपर्याप्त भएमा वा अनुगमन गर्ने निकायले कार्यथलोमा नै गई आफ्नै आँखाले तथ्य एकिन गर्न वा आयोजनाको व्यवस्थापन लगायत सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको धारणा सङ्कलन गरी कार्यान्वयनमा आउन सक्ने समस्या समयमै पहिचान तथा समाधान गर्न आवश्यक देखेमा स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्दछ । बैदागत रूपमा आयोजनाको स्थलगत अनुगमन निरीक्षणका लागि देहाय बमोजिमका क्रियाकलापहरू गर्ने गरिएको छः-

- क) आयोजनाबाट प्राप्त प्रगति प्रतिवेदनको सत्यता एकिन गर्न वास्तविकता अवलोकन गर्ने गरिएको ।
- ख) आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आइपरेका समस्याहरूबारे जानकारी लिने गरिएको ।
- ग) समस्या समाधानमा सहयोग गर्ने, आयोजना निर्माण स्थलमा नै निर्देशन दिने, समस्या समाधानका लागि व्यवस्थापनले गरेका प्रयासबारे जानकारी लिने, समस्या समाधानका निमित्त समन्वय गर्न एवम् विभिन्न विकल्पहरू पहिचान गर्ने र समस्या तथा समाधानका विकल्पका बारेमा निर्णयकर्तालाई जानकारी गराउने ।
- घ) आयोजनाका सम्बन्धमा लाभग्राही वर्ग लगायत अन्य पक्षको धारणाबारे जानकारी लिने ।
- ङ) आयोजना र अन्य पक्षबीच कुनै विवाद परेमा समाधानका लागि सहयोग गर्ने ।

अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिले निर्धारित रुजुसूचिको आधारमा सेवाग्राहीहरूसँगै व्यवस्थित तरिकाले स्थलगत भ्रमण गरी नक्सामा रहेका सूचनाको सत्यता एकिन गर्ने गरेको छ । यस्तो भ्रमणले स्थानीय समुदायसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न, नक्सामा उल्लेख गरिएका पक्षहरूलाई पुष्ट्याई गर्न, स्थानीयवासीहरूका विकास कार्यका समस्या र समाधानका उपायका बारेमा अवगत गर्न मद्दत पुगेको छ । अनुगमन, निरीक्षण तथा अवलोकनका क्रममा निम्नानुसारका विधिहरू अपाइएको थियो ।

- क) स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण तथा अवलोकन
- ख) आयोजनासँग सम्बन्धित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया
- ग) गाउँपालिकामा क्रियाशिल राजनीतिक दलका पदाधिकारी लगायतका अगुवाहरूसँगको अन्तरक्रिया
- घ) आयोजनाको उपभोक्ताहरूसँगको अन्तरक्रिया र छलफल

१.४ अनुगमनको सिमा

- ✓ महत्वकांक्षी योजनाहरूको बाहुल्यता भएकाले सम्पूर्ण योजनाहरूको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्नु,
- ✓ योजनाको प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव,
- ✓ आयोजना तर्जुमा प्रक्रियामा नै कम गुणस्तर खालका योजना तर्जुमा हुने गरेकाले नतिजा प्राप्ति गर्न कठिन,
- ✓ योजनाको अनुगमन प्रक्रिया सहज नभई खर्चिलो एवं बढी समयको खपत हुने हुँदा समय खर्चिएर अनुगमन गर्न नसकिनु,
- ✓ कठिन भौगोलिक अवस्था र उपभोक्ता समितिहरूबाट सृजना हुने अनावश्यक दवावले योजना अनुगमनमा सृजनात्मकता नभई तनावको वातावरण सृजना हुने ।

भाग-२ :- तथ्य र तथ्याङ्कको प्रस्तुती, विश्लेषण र व्याख्या

२.१ फिल्ड भ्रमण तथा अवलोकनको सारांश

२.१.१ सडक तथा गोरटो बाटो

क्र.सं	योजनाको नाम	योजनास्थल/ठेगा ना	अनुगमन मिति	विनियोजित बजेट रु.	भौतिक प्रगति % मा	अनुगमन गर्दा देखिएका तथ्य र सुझावहरु
१.	रातामाटाखोला देखि काफलचौर मो.बा निर्माण	गंगादेव-१ रोल्पा	२०८३/०२/३०	रु.८,००,०००।	९५ %	प्राविधिक लागत स्टेमेट अनुसार काम भएको थियो ।
२.	खलिङ्गा सोलिड तथा पि.सि.सि सिंढी निर्माण	गंगादेव-१ रोल्पा	२०८३/०३/२२	रु.७०,०००।	९० %	प्राविधिक लागत स्टेमेट अनुसार काम भएको थियो ।
३.	गोठीखोला सेकाइ नौ घर खेतडेरा जुगेखोला मो.बा निर्माण तथा ग्रावेल	गंगादेव-१ रोल्पा	२०८३/०३/२३	रु.७,००,०००।	९० %	प्राविधिक लागत स्टेमेट अनुसार काम भएको थियो ।
४.	वडा नं.१ मो.बा सोलिड मर्मत तथा निर्माण	गंगादेव-१ रोल्पा	२०८३/०२/२२	रु.३,५०,०००।	९० %	प्राविधिक लागत स्टेमेट अनुसार काम भएको थियो ।
५.	चैतेदशे दशै देखि घाटिचौर सम्म मो.बा निर्माण	गंगादेव-१ रोल्पा	२०८३/०३/१२	रु.९८०,०००।	९० %	प्राविधिक लागत स्टेमेट अनुसार काम भएको थियो ।
६.	खातिगाउँ मगरगाउँ घो.बा मर्मत तथा निर्माण	गंगादेव-१ रोल्पा	२०८३/०३/१२	रु.७०,०००।	९० %	प्राविधिक लागत स्टेमेट अनुसार काम भएको थियो ।

७.	घरविर मो.बा निर्माण	गंगादेव-२ रोल्पा	२०८३/०३/१६	रु.२,४०,०००।	९० %	प्राविधिक लागत स्टेमेट अनुसार काम भएको थियो ।
८.	चाखलेखेत चक्रले डाँडा खोरे खोला मो.बा निर्माण	गंगादेव-३ रोल्पा	२०८३/०१/३०	रु.४,००,०००।	९० %	प्राविधिक लागत स्टेमेट अनुसार काम भएको थियो ।
९.	मङ्ग्रा मो.वा. ग्रावेल तथा मर्मत	गंगादेव-३ रोल्पा	२०८३/०२/३१	रु.१,००,०००।	९० %	प्राविधिक लागत स्टेमेट अनुसार काम भएको थियो ।
१०.	झ्याम मोडदेखि सिमाचौर मो.वा. निर्माण	गंगादेव-३ रोल्पा	२०८३/०१/२८	रु.१,००,०००।	९५ %	प्राविधिक लागत स्टेमेट अनुसार काम भएको थियो ।
११.	लाटमारे काफलनेटी मो.बा. निर्माण	गंगादेव-३ रोल्पा	२०८३/०३/१४	रु.१,५०,०००।	९२ %	प्राविधिक लागत स्टेमेट अनुसार काम भएको थियो ।
१२.	दयाले गरेन मोटर बाटो निर्माण	गंगादेव-४ रोल्पा	२०८३/०१/२५	रु.३,००,०००।	९० %	प्राविधिक लागत स्टेमेट अनुसार काम भएको थियो ।
१३.	बसारेचौर जितेमारा थापाचोक मो बा मर्मत	गंगादेव ४ रोल्पा		रु. १०,००,०००।	९८ %	प्राविधिक लागत स्टेमेट अनुसार काम भएको थियो ।
१४.	मुलपानी देखि मेलापाखा हुँदै सिम्लेखर्क सडक निर्माण	गंगादेव-५ रोल्पा	२०८३/०३/०९	रु.६,००,०००।	९२ %	प्राविधिक लागत स्टेमेट अनुसार काम भएको थियो ।

१५.	स्याला महानेटा मोटर बाटो निर्माण	गंगादेव-५ रोल्पा	२०८३/०३/०६	रु.२,५०,०००।	९० %	प्राविधिक लागत स्टेमेट अनुसार काम भएको थियो ।
१६.	दहवाङ मोटरबाटो ग्याविन वाल निर्माण	गंगादेव-६ रोल्पा	२०८३।०३।०३	रु.५०,०००।	९५ %	प्राविधिक लागत स्टेमेट अनुसार काम भएको थियो ।
१७.	६ नं. वडा कार्यालयका बाटो सफाई	गंगादेव-६ रोल्पा	२०८३	रु.९,००,०००।	९७ %	प्राविधिक लागत स्टेमेट अनुसार काम भएको थियो ।
१८.	६ नं. वडा कार्यालयका बाटोमा ग्याविन वाल	गंगादेव-६ रोल्पा	२०८३।०१।१२	रु.३,००,०००।	९८ %	प्राविधिक लागत स्टेमेट अनुसार काम भएको थियो ।
१९.	ताप्ला हिले मोटरबाटो	गंगादेव ६ रोल्पा		रु.८,००,०००	९८ %	लागत स्टेमेट अनुसार काम भएको ।
२०.	चिप्लेपर उचाल्ने मोटरबाटो निर्माण	गंगादेव-७ रोल्पा	२०८३/०३/१९	रु.१,५०,०००।	९१ %	प्राविधिक लागत स्टेमेट अनुसार काम भएको थियो ।
२१.	सुनार गाँउ ओखरबोट मोटरबाटो निर्माण तथा स्तर उन्नती	गंगादेव-७ रोल्पा	२०८३/०३/१४	रु.४,००,०००।	९२ %	प्राविधिक लागत स्टेमेट अनुसार काम भएको थियो ।

गंगादेव गाउँपालिकाबाट आ.व.२०८२/०८३ मा सडक निर्माणको लागि प्रस्तावित योजनाहरू उपभोक्ता समिति र ठेक्का प्रक्रियाबाट निर्माण व्यवसायि मार्फत निर्माण कार्य भइरहेका छन् । दुई लाख भन्दा बढी बजेट विनियोजन भई निर्माण सम्पन्न भएका अधिकांश सडक आयोजनाहरू डिजाइन र लागत अनुमान बमोजिम निर्माण भएपनि सडक निर्माणका लागि चाहिने आधारभूत मापदण्डहरू पुरा नभएको देखियो । निर्माण सम्पन्न योजनाहरू सूचिकृत भारी उपकरणको प्रयोग गरी निर्माण सम्पन्न गरिएको देखिएकाले आगामी दिनमा उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गरिने सडक स्थानीय निर्माण औजारहरूको प्रयोग गरी निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त प्रत्येक वडाबाट सडक निर्माणका लागि प्राथमिकता निर्धारण गरी सडक निर्माणका लागि माग आउने गरेको र माग अनुरूप बजेट विनियोजन हुन नसक्दा गुणस्तरीय सडक निर्माण हुन नसकेको देखिन्छ ।

असि प्रतिशत योजना निर्माण स्थलमा योजना सूचना पाटी राख्नु पर्ने देखिन्छ ।

उपभोक्ता समितिहरूले निर्माण कार्यको प्रारम्भ देखि नै प्राविधिक सल्लाह सुझाव अनुरूप योजना कार्यान्वयनको शुरुवात भएकोले डिजाइन र लागत अनुमान बमोजिम काम मभएको काम अन्यौल नभएको पाईएकोले आगामी दिनमा प्राविधिकको निगरानीमा काम संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निर्माण व्यवसायि मार्फत निर्माण सम्पन्न भएका सडक योजनाहरूमा प्रयोग भएका सामग्री कम गुणस्तरका देखिन आएको र तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएको देखिन आएकाले आगामी दिनमा यसलाई सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ । अनुगमन गरिएका सडक तथा गोरेटो बाटो निर्माण योजनाहरूको भौतिक प्रगति ९० देखि १०० प्रतिशत भएको देखिन्छ ।

२.१.२ खानेपानी

गाउँपालिका र वडा कार्यालयबाट खानेपानीको निर्माण र मर्मतको लागि प्रयास बजेट विनियोजन भएकोमा एक घर एक धारा निर्माणको अवधारणा अनुरूप निर्माण सम्पन्न भएका, निर्माण सामग्रीमा बाह्य निर्माण सामग्रीको गुणस्तर कमहुने गरेको, प्रस्तावित गरिएको योजना र निर्माण हुने योजनामा अन्तर रहेको देखिएको छ ।

समुदायको वास्तविक आवश्यकता भएको योजनामा गुणस्तरीय काम भएको र कम आवश्यकता भएको योजनामा कामको कम गुणस्तर भएको देखिएको छ । सामग्री खरिद गर्दा खरिद सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरी सामग्री खरिद गरिएको पाईएको छ । फिटीङ् सामग्री खरिदमा पनि ध्यान नपुन्याएको र खरिद गर्नुपर्ने सामग्रीको मात्रामा फरक परेको देखिन्छ । विश्व बजारमा विभिन्न देशहरूमा भएको द्वन्दका कारण आवश्यक निर्माण सामग्रीको मुल्य साथै ढुवानीमा सम्या तथा मूल्य बृद्धि भएको देखिन्छ । अनुगमन सम्पन्न भएका योजनाहरूको भौतिक प्रगति ९० देखि १०० प्रतिशत सम्म भएको देखिन्छ ।

क्र सं	योजनाको नाम	योजनास्थल/ठेगाना	अनुगमन मिति	विनियोजित बजेट रु.	भौतिक प्रगति % मा	अनुगमन गर्दा देखिएका तथ्य र सुझावहरु
१.	छोटिखोला मगर गाउँ सेकाई खलिङ्गा खानेपानी निर्माण	गंगादेव-१ रोल्पा	२०८३/०३/१६	रु.५१,३४,०००।	१००%	तोकिय बमोजिमकाम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
२.	ओत खानेपानी मर्मत तथा निर्माण	गंगादेव-१ रोल्पा	२०८३/०२/१६	रु.७,५०,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
३.	सुखाओडार कुवा निर्माण तथा मर्मत	गंगादेव-२ रोल्पा	२०८३।०३।०१	रु.३०,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
४.	खोलाखुट्टी गाजेगैराको छेउ खोला मुहानको ट्याङ्की मर्मत तथा पाईप खरिद	गंगादेव-३ रोल्पा	२०८३/०३/०३	रु.३,५०,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
५.	बडाढुङ्गा खा.पा. निर्माण ट्याङ्कि मर्मत तथा अपुग धारा निर्माण	गंगादेव-३ रोल्पा	२०८३/०१/१७	रु.२,५०,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
६.	वलीगाउँ खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	गंगादेव-३ रोल्पा	२०८३/०१/१४	रु.१,५०,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।

७.	लोरीवीनी चौर टोल खानेपानी कुवा निर्माण	गंगादेव-३ रोल्पा	२०८३/०१/१५	रु.१,००,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
८.	बेतालब्से देखि कुरुरगारे खानेपानी मर्मत	गंगादेव ३ रोल्पा	२०८३/०३/१४	रु.१५,००,०००	९६%	
९.	गैरानेटा खा.पा मर्मत	गंगादेव-४ रोल्पा	२०८३/०३/२१	रु.७५,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
१०.	झ्याटडाँडा खा.पा निर्माण	गंगादेव-४ रोल्पा	२०८३/०१/२७	रु.१,००,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
११.	माथिल्लो बुराचौर खा.पा मर्मत तथा निर्माण	गंगादेव-४ रोल्पा	२०८३/०१/२७	रु.१,००,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
१२.	सुपाटोटके क्षेत्रेबाझा खा.पा मर्मत	गंगादेव-४ रोल्पा	२०८३/०२/०१	रु.१,००,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
१३.	खुरखुरी समालेकम्द खा पा निर्माण तथा मर्मत	गंगादेव-४ रोल्पा	२०८३/०३/१५	रु.१,५०,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
१४.	पाङ्गारुख न्याउलेखा खा पा निर्माण	गंगादेव-४ रोल्पा	२०८२/०२/०३	रु.१,००,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।

१५.	पारेघरी चौलारी खा पा मर्मत तथा निर्माण	गंगादेव-४ रोल्पा	२०८३/०१/३०	रु.१,००,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
१६.	धारापानी बाङ्गानि खा.पा निर्माण	गंगादेव-४ रोल्पा	२०८२/०२/०३	रु.५०,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
१७.	ताल्लो पुदेरा छारेगाउ खा.पा निर्माण तथा मर्मत	गंगादेव-४ रोल्पा	२०८३/०२/१५	रु.१,००,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
१८.	ओखर रुख थापा चोक सुदुरपोले खा.पा निर्माण	गंगादेव-४ रोल्पा	२०८३/०२/३१	रु.१,००,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
१९.	कुइचेखोला खा.पा मर्मत निर्माण	गंगादेव-४ रोल्पा	२०८३/०२/२८	रु.१,००,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
२०.	उतिसेखोला खा.पा निर्माण	गंगादेव-४ रोल्पा	२०८३/०१/२७	रु.१,५०,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
२१.	आरुपाते खा.पा मर्मत तथा निर्माण	गंगादेव-४ रोल्पा	२०८३/०१/२९	रु.५०,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
२२.	गरेन खा.पा मर्मत तथा निर्माण	गंगादेव-४ रोल्पा	२०८३/०१/३०	रु.१,००,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।

२३.	फिस्टेखोला गुरुगारे खा पा निर्माण	गंगादेव-४ रोल्पा	२०८२/०१/३१	रु.१,००,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
२४	माछाइने चौर खा पा निर्माण तथा मर्मत	गंगादेव-४ रोल्पा	२०८२/०१/२८	रु.५०,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
२५.	सिलाटे खोला खा पा मर्मत	गंगादेव-४ रोल्पा	२०८२/०१/२८	रु.५०,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
२६.	बाबेचारा ताल्लो माथिल्लो खा पा मर्मत	गंगादेव-४ रोल्पा	२०८३/०१/२६	रु.१,००,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
२७.	पाखेपानी खा.पा निर्माण	गंगादेव-४ रोल्पा	२०८३/०२/१३	रु.७५,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
२८	कालाखोला मछाइने लिफ्ट खानेपानी निर्माण वडा नं ४	गंगादेव ४ रोल्पा	२०८३/०३/२०	रु.६६,२०,०००।	१००%	
२९	धाराखोला दलसिङ्गे लिफ्ट खानेपानी योजना	गंगादेव ४ रोल्पा	२०८२/०२/०३	रु.२०,००,०००।	१००%	
३०	भागाचौर खानेपानी निर्माण	गंगादेव-५ रोल्पा		रु.१,५०,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।

३१.	बल्या पातल खानेपानी निर्माण	गंगादेव-६ रोल्पा	२०८३/०२/२३	रु.२,००,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
३२.	मुलखोला टोट्के माटीमिरे खानेपानी निर्माण	गंगादेव-६ रोल्पा	२०८३/०१/२०	रु.३,००,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
३३.	पानीखोला डाँडा रातामाटा खानेपानी निर्माण	गंगादेव-६ रोल्पा	२०८३/०२/१४	रु.१,००,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
३४	धुपिको रुख साउका खानेपानी मर्मत	गंगादेव-६ रोल्पा	२०८३/०१/२०	रु.,५०,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
३५	रातिघारी खानेपानी धारा निर्माण	गंगादेव-६ रोल्पा	२०८३/०१/२०	रु.१,००,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
३६	उपल्लो चौर स्यालाखोला खानेपानी मर्मत	गंगादेव-६ रोल्पा	२०८३/०१/०९	रु.१०,००,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
३७.	चौराखोला खानेपानी पाईप खरिद तथा ईन्टेक निर्माण	गंगादेव-६ रोल्पा	२०८३/०२/१२	रु.५०,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
३८.	पारनागा खोला देवलटाकुरा खर्का डाँडा खानेपानी निर्माण	गंगादेव-६ रोल्पा	२०८३/०३/०९	रु.१,००,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।

३९.	गरगरे दहवाड खानेपानी निर्माण	गंगादेव-६ रोल्पा	२०८३/०१/१५	रु.१,००,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
४०.	धप्रीखोला खानेपानी मर्मत तथा निर्माण	गंगादेव-७ रोल्पा	२०८३/०२/०४	रु.२,००,०००।	१०० %	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
४१.	सुपेगैरा खुरखुरी खानेपानी मर्मत तथा निर्माण	गंगादेव -७ रोल्पा	२०८३/०२/०४	रु.१,००,०००।	९९.९९ %	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
४२.	दुनेला खानेपानी मर्मत तथा निर्माण	गंगादेव-७ रोल्पा	२०८३/०२/०४	रु.१,००,०००।	१०० %	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
४३.	राँकडाँडा बाउनथान खानेपानी मर्मत तथा निर्माण	गंगादेव-७ रोल्पा		रु.१,००,०००।	०००	योजनाको काम नभएको ।
४४.	जायचौर खानेपानी मर्मत तथा निर्माण	गंगादेव-७ रोल्पा	२०८३/०२/०४	रु.१,००,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।
४५.	आरखोला खानेपानी मर्मत तथा निर्माण	गंगादेव -७रोल्पा	२०८३/०३/१३	रु.१,००,०००।	१००%	तोकिय बमोजिम काम गरि योजना सम्पन्न गरेको पाईयो ।

२.१.३ सिंचाई

क्र सं	योजनाको नाम	योजनास्थल/ठेगाना	अनुगमन मिति	विनियोजित बजेट रु.	भौतिक प्रगति % मा	अनुगमन गर्दा देखिएका तथ्य र सुझावहरू
१.	सातडाँडा सिंचाई पोखरी मर्मत तथा मुखोला ईन्टेक निर्माण	गंगादेव-७ रोल्पा	२०८३/०३/०७	रु.३,००,०००।	९५ %	प्राविधिक स्टेटमेन्ट अनुसार काम गरिएको थियो ।
२.						

नोट:-वार्षिक अवधिमा कुनै पनि प्रकारका सिंचाईका आयोजनाहरू निर्माण कार्य नभएकाले यहाँ उल्लेख गरिएको छैन ।

२.१.४ झोलुङ्गे पुल/ काठे पुल/ पक्की पुल निर्माण

क्र सं	योजनाको नाम	योजनास्थल / ठेगाना	अनुगमन मिति	विनियोजित बजेट रु.	भौतिक प्रगति % मा	अनुगमन गर्दा देखिएका तथ्य र सुझावहरू
१.	गोठीखोला पुल निर्माण	गंगादेव-१ रोल्पा	२०८३/०२/०५	रु.३,००,०००।	१००	लागत अनुमान बमोजिम गुणस्तरीय काम सम्पन्न भएको ।
२.	मुल खोला सल्याब पुल निर्माण	गंगादेव-१ रोल्पा	२०८३/०२/०७	रु.१,५०,०००।		लागत अनुमान बमोजिम गुणस्तरीय काम सम्पन्न भएको ।

३.	ओइलाम देखि रिजाबाड जोडने राडकोट काठे पुल निर्माण	गंगादेव-२ रोल्पा	२०८३।०१।०८	रु.१,५०,०००।		लागत अनुमान बमोजिम गुणस्तरीय काम सम्पन्न भएको ।
४.	फारुला बडामेला जोडने काठे पुल	गंगादेव-२ रोल्पा	२०८३।०१।०८	रु.१,००,०००।	१००	लागत अनुमान बमोजिम गुणस्तरीय काम सम्पन्न भएको ।
५.	गोठिखोला तराको पक्की पुल निर्माण	गंगादेव-३ रोल्पा	२०८३/०२/१७	रु.१,००,०००।		लागत अनुमान बमोजिम गुणस्तरीय काम सम्पन्न भएको ।
६.	ताप्ला बजार RCC पक्की पुल निर्माण	गंगादेव-६ रोल्पा	२०८३/०३/१२	रु.२,००,०००।		लागत अनुमान बमोजिम गुणस्तरीय काम सम्पन्न भएको
७.	भकरीखोला पुल निर्माण	गंगादेव-७	२०८३/०३/१२	रु.४,००,०००।		लागत अनुमान बमोजिम गुणस्तरीय काम सम्पन्न भएको

२.१.५ फोहोरमैला व्यवस्थापन

क्र सं	योजनाको नाम	योजनास्थल/ठेगाना	अनुगमन मिति	विनियोजित बजेट रु.	भौतिक प्रगति % मा	अनुगमन गर्दा देखिएका तथ्य र सुझावहरु
१.						

❖ वार्षिक अवधिमा कुनै पनि प्रकारका फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य नभएकाले यहाँ उल्लेख गरिएको छैन ।

२.१.६ वातावरण, जलवायु परिवर्तन, तटबन्धन तथा बाढि पहिरो नियन्त्रण

क्र सं	योजनाको नाम	योजनास्थल/ ठेगाना	अनुगमन मिति	विनियोजित बजेट रु.	भौतिक प्रगति % मा	अनुगमन गर्दा देखिएका तथ्य र सुझावहरु
१.	ताउलेखोला तटबन्धन निर्माण	गंगादेव-७	२०८३/०२/१२	रु.५,००,०००/-	९९.९९ %	प्राविधिक लागत स्टेमेट अनुसार काम सम्पन्न भएको।
२.	लामिछाने भाईबन्धु समाज पहिरो नियन्त्रण	गंगादेव-७	२०८३/०२/११	रु.४,५०,०००/-	९९.९८ %	प्राविधिक लागत स्टेमेट अनुसार काम सम्पन्न भएको।

❖ वार्षिक अवधिमा कुनै पनि प्रकारका वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्य नभएकाले यहाँ उल्लेख गरिएको छैन ।

२.१.७ आवास तथा भवन निर्माण तथा मर्मत

क्र.सं	योजनाको नाम	योजनास्थल / ठेगाना	अनुगमन मिति	विनियोजित बजेट रु.	भौतिक प्रगति % मा	अनुगमन गर्दा देखिएका तथ्य र सुझावहरू
१.	१ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण	गंगादेव-१	२०८३।०१।१ ३	रु.५०,००,०००/ -	१०० %	निर्माणको काम राम्रो गरिएको पाईयो ।
२.	ओत स्वास्थ्य चौकीमा कुरुवा कक्ष निर्माण तथा बर्थिङ सेन्टर मर्मत सम्भार तथा प्लासेन्टा पिट निर्माण	गंगादेव-१	२०८२/०३/० ८	रु.१५,००,०००/ -	९२ %	निर्माणको राम्रो गरिएको पाईयो ।
३.	सिद्ध प्रा वि रमाई भित्रि कोठा प्लास्टर	गंगादेव-२	२०८३।०१।० ८	१५,००,०००/-	१०० %	निर्माणको राम्रो गरिएको पाईयो ।
४.	२.नं वडा कार्यालय भवन निर्माण	गंगादेव -२	२०८३।०१।० ८	रु.७५,००,०००/ -	१०० %	निर्माणको राम्रो गरिएको पाईयो ।
५.	सिद्धार्थ आ.वि गंगादेव २ ओईलाम भवन निर्माण	गंगादेव -२	२०८३।०३।१ ७	रु.७५,००,०००/ --	१०० %	निर्माणको राम्रो गरिएको पाईयो ।

६.	श्री गंगा मा.वि चौताराडाडाँ गंगादेव-२ रोलपा	गंगादेव -२	२०८३।०२।२०	रु.१,२०,००,०००/-	१०० %	निर्माणको राम्रो गरिएको पाईयो ।
७.	कुकुरगारे आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा वर्थीड सेन्टर प्लासेन्टा पिट निर्माण	गंगादेव -३	२०८२/०३/१५	रु.५०,००,०००/-	१०० %	निर्माणको राम्रो गरिएको पाईयो ।
८.	जनता बिकास मा.वि गंगादेव-४ सुपाटोट्के अधुरो भवन निर्माण	गंगादेव -४	२०८३।०३।२२	रु.७५,००,०००/-	९८ %	प्राविधिक स्टेमेट अनुसार काम कम भएको ।
९.	बालबिकास केन्द्र ठारापानीको बिध्यालय भवन निर्माण	गंगादेव -४	२०८३।०३।१७	रु.१०,००,०००/-	१०० %	निर्माणको राम्रो गरिएको पाईयो ।
१०.	५ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण	गंगादेव-५	२०८३।०१।२१	रु.५०,००,०००/-	१०० %	निर्माणको राम्रो गरिएको पाईयो ।
११.	स्वास्थ्य कार्यालय मर्मत	गंगादेव-५	२०८३।०३।१०	रु.५०,०००/-	९९.५ %	निर्माणको राम्रो गरिएको पाईयो ।
१२.	बालबोध आ.वि झाक्रिसल्ला भौतिक पुर्बाधार निर्माण	गंगादेव-५	२०८३।०३।१०	रु.२५,००,०००/-	९९ %	निर्माणको राम्रो गरिएको पाईयो ।
१३.	गुराँसेतरा प्रा.वि बिध्यालय भवन निर्माण	गंगादेव-५	२०८३।०३।१७	रु.१०,००,०००/-	९९ %	निर्माणको राम्रो गरिएको पाईयो ।

१४.	गोरजले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा वर्थीड सेन्टर तथा प्लासेन्टा पिट निर्माण	गंगादेव-६	२०८३।०३।१ १	रु.१५,००,०००/- -	९९ %	निर्माणको राम्रो गरिएको पाईयो ।
१५.	वडा नं.६ को वडा कार्यालयको अधुरो भवन निर्माण	गंगादेव-६	२०८३।०३।१ ६	रु.६,००,०००/-	९९ %	निर्माणको राम्रो गरिएको पाईयो ।
१६.	जायखोला आमा समुह फिल्ड तथा भवन निर्माण	गंगादेव-७	२०८७/०३/१ २	रु.२,००,०००/-	९७ %	निर्माणको राम्रो गरिएको पाईयो ।
१७.	सुपेगौरा आमा समुह भवन मर्मत	गंगादेव-७	२०८३/०३/१ ४	रु.१,००,०००/-	९० %	निर्माणको राम्रो गरिएको पाईयो ।
१८.	चन्द्रसुर्ण यूवा क्लव फिल्ड तथा भवन निर्माण	गंगादेव-७	२०८३/०३/१०	रु.२,००,०००/-	९५ %	निर्माणको राम्रो गरिएको पाईयो ।

२.१.८ उर्जा एवं विद्युतीकरण

क्र सं	योजनाको नाम	योजनास्थल/ठे गाना	अनुगमन मिति	विनियोजित बजेट रु.	भौतिक प्रगति % मा	अनुगमन गर्दा देखिएका तथ्य र सुझावहरु
१.						

✓ वार्षिक अवधिमा कुनै पनि प्रकारका उर्जा एवं विद्युतीकरण सम्बन्धी आयोजनाहरु निर्माण कार्य नभएकाले यहाँ उल्लेख गरिएको छैन ।

२.१.९ पर्यटन प्रवर्द्धन एवं सांस्कृतिक सम्पदा

क्र सं	योजनाको नाम	योजनास्थल/ठेगाना	अनुगमन मिति	विनियोजित बजेट रु.	भौतिक प्रगति % मा	अनुगमन गर्दा देखिएका तथ्य र सुझावहरू
१.	जहेले धार्मिक मन्दिर निर्माण	गंगादेव-३ रोल्पा	२०८२/०३/०५	रु.२,५०,०००।	९९.९९ %	निर्माण कार्य राम्रो गरेको पाईयो ।
२.	मुर्देकाटन मन्दिर निर्माण	गंगादेव-४ रोल्पा	२०८२/०२/१५	रु.१,००,०००।	९९.९९ %	निर्माण कार्य राम्रो गरेको पाईयो ।
३.	डाँडाबाँफु सालिक निर्माण	गंगादेव-४ रोल्पा	२०८२/०३/११	रु.०,००,०००।	९९.९९ %	निर्माण कार्य नभएको ।
४.	देवकोटा मन्दिर निर्माण	गंगादेव-५ रोल्पा	२०८३/०२/२७	रु.९०,०००।	९९.९९ %	निर्माण कार्य राम्रो गरेको पाईयो ।
५.	धप्रिखोला नारायण पुजाई फिल्ड तथा मन्दिर निर्माण	गंगादेव-७ रोल्पा	२०८३/०३/१२	रु.१,००,०००।	९९.९९ %	निर्माण कार्य राम्रो गरेको पाईयो ।

२.१.१० कृषि तथा पशु विकास

क्र सं	योजनाको नाम	योजनास्थल /ठेगाना	अनुगमन मिति	विनियोजित बजेट रु.	भौतिक प्रगति % मा	अनुगमन गर्दा देखिएका तथ्य र सुझावहरू
--------	-------------	-------------------	-------------	--------------------	-------------------	--------------------------------------

१.	सिंचाई फोखरी निर्माण ७५ % अनुदान	गंगादेव-१	२०८३/०३/१४	रु.२,५५,०००/-		सन्तोषजनक काम भएको ।
२.	कृषि संकलन केन्द्र निर्माण	गंगादेव-३	२०८३/०३/२२	रु.१०,००,०००/-	९५ %	समयमा काम नभएकोले काम कम भएको ।
३.	कि.बिको पोलतार व्यवस्थपन ७५ % अनुदान	गंगादेव-४	२०८३/०३/२०	रु.१,००,०००/-	१०० %	सन्तोषजनक काम भएको ।
४.	रष्ट्रिक स्टोर निर्माण १०० % अनुदान	गंगादेव-६	२०८३/०२/२१	रु.४०,०००/-	१०० %	सन्तोषजनक काम भएको ।
५.	कि.बिको पोलतार व्यवस्थपन ७५ % अनुदान	गंगादेव-७	२०८३/०३/१८	रु.१,००,०००/-	९९.९९ %	सन्तोषजनक काम भएको ।

✓ कृषि तथा पशुविकास अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू सम्बन्धित शाखाको कर्मचारीसँगको निगरानीमा हुने गरेको र प्राविधिक सल्लाह बमोजिम काम संचालन भएकाले गुणस्तरीय काम भएको देखिन्छ र सम्पन्न योजनाहरूको भौतिक प्रगति ९० देखि १०० प्रतिशत रहेको छ ।

२.१.११ शौचालय/ प्रतिक्षालय / घेरवार / फिल्ड निर्माण तथा मर्मत

क्र सं	योजनाको नाम	योजनास्थल/ठेगाना	अनुगमन मिति	विनियोजित बजेट रु.	भौतिक प्रगति % मा	अनुगमन गर्दा देखिएका तथ्य र सुझावहरू
१.	खेलकुद फिल्ड व्यवस्थापन ओत	गंगादेव-१ रोल्पा	२०८३/०१/२३	रु.७,००,०००।	१०० %	लागत अनुमान बमोजिम गुणस्तरीय काम सम्पन्न भएको
२.	जिनाबाड स्वास्थ्य चौकी मेसिनरी वाल निर्माण	गंगादेव-२ रोल्पा	२०८३।०३।१५	रु.४,००,०००।	१००	लागत अनुमान बमोजिम गुणस्तरीय काम सम्पन्न भएको
३.	जनचेतना प्रा.वि बडामेला घेरवार	गंगादेव-२ रोल्पा	२०८३।०२।०९	रु.१,००,०००।	१००	लागत अनुमान बमोजिम गुणस्तरीय काम सम्पन्न भएको
४.	पुर्णगाउँ एकता मण्डली घेरवार	गंगादेव-२ रोल्पा	२०८३।०२।०९	रु.५०,०००।	१०० %	लागत अनुमान बमोजिम काम सम्पन्न भएको
५.	वडा नं. ३ को बाल र नाला निर्माण	गंगादेव-३ रोल्पा	२०८३/०३/०४	रु.५,००,०००।	१०० %	लागत अनुमान बमोजिम गुणस्तरीय काम सम्पन्न भएको
६.	हलहले ब्रह्मा मन्दिर शौचालय निर्माण	गंगादेव -३ रोल्पा	२०८२/०३/०५	रु.१,००,०००।	१०० %	मन्दिर निर्माणको काम सम्पन्न भएको र लागत अनुमान बमोजिम भएको

७.	सब्दाह निर्माण ३ र २ मरोटघाट गंगादेव जिनाबाड रोल्पा	वडा नं २ र ३ रोल्पा	२०८३/०२/१६	रु.१२,००,०००/-		लागत अनुमान बमोजिम गुणस्तरीय काम सम्पन्न भएको ।
८.	सुपेगैरा प्रतिकक्षालय निर्माण	गंगादेव-४ रोल्पा	२०८२/०३/०८	रु.१,००,०००।	१०० %	लागत अनुमान बमोजिम गुणस्तरीय काम सम्पन्न भएको
९.	सरस्वती माध्यामिक विद्यालय	गंगादेव-४ रोल्पा		रु. ५,००,०००।	९७ %	
१०.	सल्लीचौर फिल्ड निर्माण	गंगादेव-६ रोल्पा	२०८३/०१/२०	रु.१,००,०००।	१०० %	लागत स्टेमेट अनुसार काम भएको
११.	छरीखोला प्रतिकक्षालय निर्माण	गंगादेव-६ रोल्पा	२०८३/०१/२०	रु.१,५०,०००।	१०० %	लागत स्टेमेट अनुसार काम भएको
१२.	जन विकास प्रा. वि नेटापरी शौचालय मर्मत तथा निर्माण	गंगादेव-६ रोल्पा	२०८३/०१/२६	रु.१,००,०००।	१०० %	लागत स्टेमेट अनुसार काम भएको
१३.	वडा नं.७ को वडा कार्यालयको पहिरो नियन्त्रण तथा घेरबार	गंगादेव-७ रोल्पा	२०८३/०१/२६	रु.१०,००,०००।	१०० %	लागत स्टेमेट अनुसार काम भएको

१४.	वडा कार्यालय घेरबार तथा भवन व्यवस्थापन	गंगादेव-७ रोल्पा	२०८३/०३/१ ९	रु.३,५०,०००।	१०० %	लागत स्टेमेट अनुसार काम भएको
१५.	पृथ्वी नारायण मा.वि फिल्ड निर्माण	गंगादेव-७ रोल्पा	२०८३/०३/१ ९	रु. १०,००,०००।	९८ %	प्राविधिक लागत अनुसार पुर्णरूपमा काम सम्पन्न भएको

भाग ३ :- प्रमुख उपलब्धीहरू

- ✓ उपभोक्ता समितिले प्राविधिकको प्रत्यक्ष निगरानीमा निर्माण कार्य गर्ने भएकाले उक्त काम गुणस्तरयुक्त हुने गरेको ।
- ✓ आवधिक रूपमा योजनाको अनुगमन र सुपरीवेक्षण हुने हुँदा प्रस्तावित योजनाहरूलाई मनोमानी रूपमा कार्यान्वयन गर्नमा कमी आएको ।
- ✓ अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको सिफारिस अनुरूप योजनाको भुक्तानी गर्ने प्रावधानले गर्दा गुणस्तरीय काम हुने गरेको ।
- ✓ दबाबको भरमा भुक्तानी गर्ने परिपाटीको अन्त्य भएको ।

भाग ४ : प्रमुख समस्याहरू

- ✓ टुक्रे योजनाहरूको संख्या धेरै भएकाले अनुगमन गर्न कठिनाई हुने गरेको ।
- ✓ एउटै योजनाको नाममा धेरै ठाउँमा काम हुने भएकाले अनुगमनलाई चूस्त दुरुस्त गर्न नसकिएको ।
- ✓ अनुगमन कार्य वडास्तरका जनप्रतिनिधीको कम संलग्नता हुने गरेको र उपभोक्ता समितिको अध्यक्षलाई मात्र उक्त काममा जिम्मेवार बनाउने गरेको ।
- ✓ अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक निर्धारित समयमा नहुनु, बैठक भए पनि औपचारिकतामा सिमित रहनु ।
- ✓ निर्धारित समय र तोकिएको ढाँचामा अनुगमन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने नगरेको ।
- ✓ अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबाट प्राप्त पृष्ठपोषणको कार्यान्वयन नहुने ।
- ✓ अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूमा उत्प्रेरणाको अभाव हुने गरेको ।
- ✓ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीका लागि सवारी साधनको अभाव रहनु ।
- ✓ निष्पक्ष तथा वस्तुगत कार्य सम्पादन अनुगमन र मूल्यांकन गरी पुरस्कार, सुधार तथा दण्डको नीति अबलम्बन नगर्नु ।
- ✓ काम समयमै समाप्त गरेका योजनाहरू भुक्तानीको लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फाइल पेश गर्ने परिपाटीले अनुगमनमा समस्या देखिएको ।
- ✓ आधुनिक र वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोग अपेक्षित रूपमा हुन नसक्नु ।

भाग ५:- सिकाईहरू

- ✓ निश्चित समय तालिका अनुसार अनुगमन गर्दा दैनिक सेवा प्रवाहमा समस्या हुने नगरेको ।
- ✓ उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीहरूलाई पूर्व सूचना गरेर अनुगमन गर्दा सम्पूर्ण सदस्यहरूसँग छलफल र पृष्ठपोषण गर्न सहज हुने गरेको ।

- ✓ अनुगमन कार्यमा समग्र समितिका सदस्यहरुको अनिवार्य उपस्थितीले भुक्तानी सिफारिसमा सहज हुने गरेको ।

भाग ६:- निष्कर्ष र सुझावहरु

६.१. निष्कर्ष

नेपालमा राजनीतिक रुपान्तरणको कार्य सम्पन्न भए पश्चात् तीनै तहका सरकारहरुले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अभ्यास गरिरहेको छ । तसर्थ सङ्घीयताको अभ्यास गर्ने क्रममा गाउँपालिकाको अवको ध्यान आर्थिक समाजिक रुपान्तरणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने वास्तविकतालाई हृदयंगम गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारमा गंगादेव गाउँपालिकाले दिगो एवं समृद्ध विकास गरेर त्यस दिशातर्फ गाउँपालिका अघि बढ्न खोजिरहेको छ । विद्यमान शासन प्रणालीमा भएको रुपान्तरण सँगसँगै जनताका आधाभूत माग र अपेक्षा बढ्दै गएको सन्दर्भमा जनताले परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूती गर्ने गरी गाउँपालिकाको समग्र विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु अति जरुरी देखिएको छ । अन्यथा नयाँ व्यवस्थाप्रति पनि जनताको विश्वास र भरोसा विस्तारै घट्दै र हट्दै जानसक्छ । यसको परिणाम स्वरूप कठिन संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त नयाँ व्यवस्था पनि असफल हुन गई सिंगो देश नै असफल राष्ट्र बन्ने दिशातर्फ अघि बढ्न सक्छ । तसर्थ उपरोक्त सुझावहरुलाई ग्रहण गर्दै गंगादेव गाउँपालिकाको योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमन एवं मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

६.२. सुझावहरु

- ✓ स्तरीय तथा सहभागित्मक अनुगमनमा जोड दिने ।
- ✓ अनुगमन पश्चात पृष्ठपोषण, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने ।
- ✓ आउँदा क्रियाकलाप र नतिजामूलक अनुगमनलाई फरक फरक स्तरमा राखी प्रतिफलमा नभई प्रभावकारी अनुगमनमा जोड दिने ।
- ✓ नतिजामूलक तथा प्रभावकारी अनुगमन, मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास र अभ्यास गर्ने ।
- ✓ एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास तथा अनुगमन मूल्यांकनको कार्यशैली प्रक्रिया र संरचनामा परिवर्तन गरी स्वचालित संयन्त्रको निर्माण गर्ने ।
- ✓ अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यमा संलग्न जनशक्तिको सीप र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने ।
- ✓ आयोजना कार्यक्रमहरूसँग सम्बन्धित निकाय र जनशक्तिको कार्य सम्पादन मूल्यांकनलाई आयोजनाको प्रगतिसँग आवद्ध गर्ने ।
- ✓ अनुगमन तथा मूल्यांकनबाट प्राप्त नतिजालाई योजना कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा कार्यान्वयनमा पृष्ठपोषणको रुपमा प्रयोग गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने ।

- ✓ स्वतन्त्र तथा तेस्रो पक्षबाट पनि अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यका लागि आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्नुपर्ने ।
- ✓ सार्वजनिक सरोकारका आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकनमा लाभग्राही सरोकारवाहरूलाई समेत संलग्न गराउनुपर्ने ।
- ✓ सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने वेवमा आधारित तथा स्वचालित अनुगमन प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने ।
- ✓ आगामी दिनहरूमा योजनाको अनुगमन गर्दा Solstice एपको प्रयोग गरेमा प्रभावकारी अनुगमन हुन जाने र तत्काल प्रतिवेदन पनि स्वतः निर्माण हुने हुँदा यो मोबाइल एपको प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुने ।
- ✓ अनुगमन मूल्याङ्कनको लागि निश्चित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- ✓ हरेक विषयगत शाखाको वार्षिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने ।
- ✓ आगामी दिनहरूमा पालिकाबाट निर्माण हुने योजनाहरूमा ५ लाख भन्दा माथिका योजनाहरू अनिवार्य अनलाईन ठेक्का प्रक्रियाबाट निर्माण गर्दा समग्र पालिका तथा जनताको हितमा विकास निर्माण हुनेमा विश्वस्त हुन देखिन्छ ।

आर्थिक प्रशासन शाखा

क्र.सं.	खर्च संकेत नं.	खर्च शीर्षक	अन्तिम बजेट	यस महिना सम्मको निकास	यस महिना सम्मको खर्च	पेशकी कटाई बाँकी खर्च	बजेट बाँकी
१	२१११	पारिश्रमिक कर्मचारी	१४५,४५१,०००.००	१३४,४६५,९९६.८६	१३४,४६५,९९६.८६	१३४,४६५,९९६.८६	१०,९८५,००३.१४
२	२१११२	पारिश्रमिक पदाधिकारी	८,५००,०००.००	७,६३८,५००.००	७,६३८,५००.००	७,६३८,५००.००	८६१,५००.००
३	२११२१	पोशाक	९४६,०००.००	४६३,०००.००	४६३,०००.००	४६३,०००.००	४८३,०००.००
४	२११२३	औषधीउपचार खर्च	१,०००,०००.००	६८०,०००.००	६८०,०००.००	६८०,०००.००	३२०,०००.००
५	२११३१	स्थानीय भत्ता	१,२००,०००.००	१,१७९,५८०.००	१,१७९,५८०.००	१,१७९,५८०.००	२०,४२०.००
६	२११३२	महंगी भत्ता	२,४००,०००.००	१,२४०,०००.००	१,२४०,०००.००	१,२४०,०००.००	१,१६०,०००.००
७	२११३३	फिल्ड भत्ता	२,०००,०००.००	१,९२८,२८३.००	१,९२८,२८३.००	१,९२८,२८३.००	७१,७१७.००
८	२११३४	कर्मचारीको बैठक भत्ता	२,०८५,०००.००	१,५६८,३१०.००	१,५६८,३१०.००	१,५६८,३१०.००	५१६,६९०.००
९	२११३५	कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार	१,०००,०००.००	७९४,१६०.००	७९४,१६०.००	७९४,१६०.००	२०५,८४०.००
१०	२११३९	अन्य भत्ता	३००,०००.००	०.००	०.००	०.००	३००,०००.००
११	२११४१	पदाधिकारी बैठक भत्ता	२,२६०,०००.००	१,६१२,०००.००	१,६१२,०००.००	१,६१२,०००.००	६४८,०००.००
१२	२१२११	कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोष खर्च	१००,०००.००	०.००	०.००	०.००	१००,०००.००
१३	२१२१४	कर्मचारी कल्याण कोष	१,०००,०००.००	०.००	०.००	०.००	१,०००,०००.००
१४	२२१११	पानी तथा बिजुली	१,१४०,०००.००	५०१,९२७.००	५०१,९२७.००	५०१,९२७.००	६३८,०७३.००
१५	२२११२	संचार महसुल	१,४४१,०००.००	१,१३४,६७१.००	१,१३४,६७१.००	१,१३४,६७१.००	३०६,३२९.००
१६	२२२११	इन्धन (पदाधिकारी)	७००,०००.००	४४८,७५७.००	४४८,७५७.००	४४८,७५७.००	२५१,२४३.००
१७	२२२१२	इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	१,०८५,०००.००	५६२,९०१.००	५६२,९०१.००	५६२,९०१.००	५२२,०९९.००

१८	२२२१३	सवारी साधन मर्मत खर्च	१,७७५,०००.००	१,७७१,६४६.००	१,७७१,६४६.००	१,७७१,६४६.००	३,३५४.००
१९	२२२२१	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	९९०,०००.००	७८७,४३३.००	७८७,४३३.००	७८७,४३३.००	२०२,५६७.००
२०	२२३११	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	३,६००,०००.००	२,६७६,३६५.००	२,६७६,३६५.००	२,६७६,३६५.००	९२३,६३५.००
२१	२२३१३	पुस्तक तथा सामग्री खर्च	५००,०००.००	०.००	०.००	०.००	५००,०००.००
२२	२२३१४	इन्धन - अन्य प्रयोजन	५००,०००.००	०.००	०.००	०.००	५००,०००.००
२३	२२३१५	पत्रपत्रिका, छुपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	१,९९०,०००.००	१,७२०,४७४.००	१,७२०,४७४.००	१,७२०,४७४.००	२६९,५२६.००
२४	२२३१९	अन्य कार्यालय संचालन खर्च	५,५११,८४६.०४	२,५८५,५२९.००	२,५८५,५२९.००	२,५८५,५२९.००	२,९२६,३१७.०४
२५	२२४११	सेवा र परामर्श खर्च	५००,०००.००	०.००	०.००	०.००	५००,०००.००
२६	२२४१२	सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च	९००,०००.००	२८९,८५०.००	२८९,८५०.००	२८९,८५०.००	६१०,१५०.००
२७	२२४१३	करार सेवा शुल्क	५२,३२८,०००.००	५२,३२१,१०८.००	५२,३२१,१०८.००	५२,३२१,१०८.००	६,८९२.००
२८	२२५११	कर्मचारी तालिम खर्च	३,०००,०००.००	२८९,१०४.००	२८९,१०४.००	२८९,१०४.००	२,७१०,८९६.००
२९	२२५१२	सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च	५२५,०००.००	०.००	०.००	०.००	५२५,०००.००
३०	२२५२२	कार्यक्रम खर्च	१७,७२३,०००.००	१२,०१२,७५४.००	१२,०१२,७५४.००	१२,०१२,७५४.००	५,७१०,२४६.००
३१	२२५२९	विविध कार्यक्रम खर्च	३८,२८७,०००.००	१८,०७५,६४६.००	१८,०७५,६४६.००	१८,०७५,६४६.००	२०,२११,३५४.००
३२	२२६११	अनुगमन, मूल्यांकन खर्च	१,३५०,०००.००	१,०५२,५००.००	१,०५२,५००.००	१,०५२,५००.००	२९७,५००.००
३३	२२६१२	भ्रमण खर्च	३,७५०,०००.००	३,६६१,२००.००	३,६६१,२००.००	३,६६१,२००.००	८८,८००.००
३४	२२६१९	अन्य भ्रमण खर्च	९५६,६२०.००	६६,५००.००	६६,५००.००	६६,५००.००	८९०,१२०.००

३५	२२७११	विविध खर्च	५,७५६,०००.००	३,००१,०१९.००	३,००१,०१९.००	३,००१,०१९.००	२,७५४,९८१.००
३६	२२७२१	सभा सञ्चालन खर्च	५००,०००.००	४६४,४५०.००	४६४,४५०.००	४६४,४५०.००	३५,५५०.००
३७	२५३११	शैक्षिक संस्थाहरूलाई सहायता	३७,७४२,०००.००	३२,२९९,५४३.००	३२,२९९,५४३.००	३२,२९९,५४३.००	५,४४२,४५७.००
३८	२५३१२	स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सहायता	९५,०००.००	०.००	०.००	०.००	९५,०००.००
३९	२७२११	छात्रवृत्ति	१,०८१,०००.००	६६९,०००.००	६६९,०००.००	६६९,०००.००	४१२,०००.००
४०	२७२१२	उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना खर्च	५००,०००.००	४९८,९९६.००	४९८,९९६.००	४९८,९९६.००	१,००४.००
४१	२७२१३	औषधीखरिद खर्च	२,२६३,०००.००	२,१०५,७७४.००	२,१०५,७७४.००	२,१०५,७७४.००	१५७,२२६.००
४२	२७२१९	अन्य सामाजिक सहायता	५००,०००.००	५०,०००.००	५०,०००.००	५०,०००.००	४५०,०००.००
४३	२८१४२	घरभाडा	१,६००,०००.००	१,६००,०००.००	१,६००,०००.००	१,६००,०००.००	०.००
४४	२८१४३	सवारी साधन तथा मेशिनर औजार भाडा	५७०,०००.००	४८३,०००.००	४८३,०००.००	४८३,०००.००	८७,०००.००
४५	२८१४९	अन्य भाडा	१,२५८,०००.००	७६६,८७४.००	७६६,८७४.००	७६६,८७४.००	४९१,१२६.००
४६	२८९११	भैपरी आउने चालु खर्च	१,५००,०००.००	०.००	०.००	०.००	१,५००,०००.००
४७	३१११२	गैर आवासीय भवन निर्माण/ खरिद	२३,०८०,०००.००	२१,५८५,५९०.००	२१,५८५,५९०.००	२१,५८५,५९०.००	१,४९४,४१०.००
४८	३१११४	जग्गा विकास कार्य	१,५००,०००.००	०.००	०.००	०.००	१,५००,०००.००
४९	३११२२	मेशिनरी तथा औजार	२,४८५,०००.००	१,७१८,६४३.००	१,७१८,६४३.००	१,७१८,६४३.००	७६६,३५७.००
५०	३११२३	फर्निचर तथा फिक्चर्स	१,०००,०००.००	८२१,३७२.००	८२१,३७२.००	८२१,३७२.००	१७८,६२८.००
५१	३११३१	पशुधन तथा बागवानी विकास खर्च	८६०,०००.००	३५०,२७७.००	३५०,२७७.००	३५०,२७७.००	५०९,७२३.००

५२	३११५१	सडक तथा पूल निर्माण	२४,५९३,०००.००	१८,९१४,८१८.००	१८,९१४,८१८.००	१८,९१४,८१८.००	५,६७८,१८२.००
५३	३११५४	तटबन्ध तथा बाँधनिर्माण	६५०,०००.००	६१९,५००.००	६१९,५००.००	६१९,५००.००	३०,५००.००
५४	३११५५	सिंचाई संरचना निर्माण	३००,०००.००	२८३,०००.००	२८३,०००.००	२८३,०००.००	१७,०००.००
५५	३११५६	खानेपानी संरचना निर्माण	३३,८५९,०००.००	२२,४३०,३२४.००	२२,४३०,३२४.००	२२,४३०,३२४.००	११,४२८,६७६.००
५६	३११५७	वन तथा वातावरण संरक्षण	२००,०००.००	१९९,९८८.००	१९९,९८८.००	१९९,९८८.००	१२.००
५७	३११५८	सरसफाई संरचना निर्माण	५००,०००.००	४९९,१९०.००	४९९,१९०.००	४९९,१९०.००	८१०.००
५८	३११५९	अन्य सार्वजनिक निर्माण	४४,२५२,०००.००	३५,९५०,६५७.००	३५,९५०,६५७.००	३५,९५०,६५७.००	८,३०१,३४३.००
जम्मा			४९३,४३८,४६६.०४	३९६,८४०,२०९.८६	३९६,८४०,२०९.८६	३९६,८४०,२०९.८६	९६,५९८,२५६.१८

राजस्व प्रशासन शाखा

कृषि विकास शाखा

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	बजेट रु. हजारमा	खर्च रकम रु. हजारमा	क्रियाकलापहरु	लाभान्वित कृषक संख्या
१	उन्नत तथा हाइब्रेड जातका तरकारीको विउ निशुल्क वितरण कृषक समुह, कृषि फर्म	५,००	५,००	बन्दा सिमि करेला धनिया केराउ फर्सी तरकारी वालिहरुको विउ खरिद गरी कृषकहरुलाई निशुल्क वितरण	१०५०
२	आकस्मीक वाली संरक्षण सेवा अन्तर्गत विषादि खरिद तथा वितरण	३,००	३,००	विभिन्न वालिहरुमा लाग्ने रोग तथा किराहरु व्यवस्थापन गर्ने विषादिहरु खरिद गरी आवश्यकताको आधारमा कृषकहरुलाई वितरण	७३०
३	खेतवारी जोत्ने मिनिटिलर खरिद तथा वितरण ५० प्रतिशत अनुदान कृषक समुह, कृषि फर्म वाड नं. १२२	३,१५	३,०३	११ वटा मिनिटिलर खरिद गरि कृषक समुह र कृषि फर्महरुमा वितरण गरिएको	१२०

४	खेतवारी जोत्ने मिनिटिलर खरिद तथा वितरण ७० प्रतिशत अनुदान कृषक समुह, कृषि फर्म	२,५०	२,२८	६ वटा मिनिटिलर खरिद गरि कृषक समुह र कृषि फर्म मार्फत वितरण गरिएको	५०
५	कृषकहरूलाई १०० प्रतिशत अनुदानमा माहुरी पालन तथा कृषि उत्पादनमा आवश्यक पर्ने कृषि उपकरणहरू खरिद तथा वितरण	१,७०	१,७०	माहुरी पालनमा प्रयोग हुने पन्जा घुम्टी रानी गेट धुवादानी लगाएत अन्य सिकेचर आरी स्प्रेयर खरिद गरी कृषकलाई वितरण	९०
६	कृषक समुह र कृषि फर्मलाई १०० प्रतिशत अनुदानमा प्लाष्टीक टलेल खरिद तथा वितरण	३,६०	३,५०	प्लाष्टीक टनेल खरिद गरी आवश्यकताको आधारमा कृषकलाई वितरण	४०
७	थोपा सिँचाईको लागी १०० प्रतिशत अनुदानमा सिँचाई हिल टंकी वितरण वाड नं. २,३,४,५,६ र ७	२,१५५	२,१४९	५०० लिटरको हिल टंकी खरिद गरी समुह मार्फत कृषकहरूलाई वितरण	वाड नं. २ देखी ७ सम्का ३७५ जना कृषक परिवार

८	सिँचाई पोखरी निर्माण ७५ प्रतिशत अनुदान वाड नं. १	२,५५	२,५४	२ वटा सिँचाई पोखरी निर्माण	५० कृषक परिवारलाई सिँचाई सुविधा हुने
९	फारुला कृषक समुहलाई गत आ.व.मा अपुग पाईप वितरण ७५ प्रतिशत अनुदान वाड नं. २	१,५०	१,५०	४०mm को पाईप खरिद गरी समुहलाई हस्तान्तरण	३२ कृषक परिवारलाई सिँचाई सुविधा हुने
१०	सिँचाई पाईप वितरण ७५ प्रतिशत अनुदान कृषकहरुको सहभागिता वाड नं. ६	२,२५	२,२५	३२mm को पाईप खरिद गरी समुहलाई हस्तान्तरण	२५ कृषक परिवारलाई सिँचाई सुविधा हुने
११	रष्टीक स्टोर मर्मत १०० प्रतिशत अनुदान वाड नं.६	४०	३७	रष्टीक स्टोरमा जाली र रड लगाउने काम	३०
१२	किविको पोलतार व्यवस्थापन ७५ प्रतिशत अनुदान वाड नं. ४	१,००	९७	८७ वटा किविको पोल निर्माण	१०
१३	किविको पोलतार व्यवस्थापन ७५ प्रतिशत अनुदान वाड नं. ७	१,००	०	८० वटा किविको पोल निर्माण	८

	जम्मा	४,८२०	४,७६३		
--	-------	-------	-------	--	--

❖ समग्र वित्तिय प्रगती : ९८.८१ प्रतिशत।

पशु सेवा शाखा

क्र.स	क्रियाकलाप विवरण	पशुपछीं विवरण								जम्मा
		गाई/गो रु	भैसी/राँ गा	भेडाबा खा	बडगु र	घो डा	कुकु र	कुखुरा	हाँ स	
१	मेडिकल उपचार	६३४	२३२	११२०	२४		५१	६८६ ०		८९२१
२	माईनर सर्जिकल उपचार	४	३	३९						४६
३	मेजर सर्जिकल									
४	गाईनोकोलोजि कल उपचार	४०	१०४	४६०						६०४
५	पशुपछीं बन्ध्याकरण सेवा	९८		६०२	५७					७५७
६	रेबिज						४० ०			४००
७	पि.पि.आर.			९६५०						९६५०
८	आन्तरिक परजिवी	४३०	४४५	८४६५	११ ०		४०	५४२ ०		१४९१ ०
९	बाहिय परजिवी	४६५	१२०	९८२०			२०	१४३ ०		११८५ ५

सेवा ग्राहिहरु

क्र.सं.	सेवा लाभग्राही विवरण	संख्या
१.	सेवाग्राही कृषकको विवरण	
२.	महिला	२८६५
३.	पुरुष	१०५५
४.	सामाजिक सहभागिता	
५.	जनजाती	१५६०
६.	दलित	४९५
७.	अन्य	१८६५

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	लक्षित वर्ग	स्वीकृत बजेट	खर्च रकम
१	अपाङ्गता पहिचान तथा बैठक सञ्चालन	अपाङ्गता भएका व्यक्ति	२०००००	९००००
२	लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान	महिला तथा समुदाय	१५०००	१३०००
३	बालश्रम, बालविवाह, बहुविवाह, दाईजो, बोकसी, छाउपडी जस्ता कुप्रथा रोकथाम कार्यक्रम	किशोर-किशोरी/अभिभावक/धामिझाक्री	४०००००	३३६७७०
४	ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	ज्येष्ठ नागरिक	५०२९००	५०१०९०

५	सहायक सामग्री वितरण कार्यक्रम	शारीरिक अपाङ्गता भएका		
६	प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्य	कार्यालय संचालन		

मुख्य कार्य तथा भौतिक प्रगति विवरणः

क्रियाकलाप	मुख्य कार्य सम्पादन तथा भौतिक उपलब्धिहरू
अपाङ्गता पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण	- स्थानीय अपाङ्गता समन्वय समितिको नियमित मासिक बैठक सञ्चालन र निवेदनहरूको विस्तृत छानविन, - प्रकृतिका आधारमा (क, ख, ग, घ वर्ग) वर्गीकरण गरी अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण भएको, जसले गर्दा लक्षित वर्गको सामाजिक सुरक्षा र सरकारी सेवामा पहुँच सुनिश्चित भएको छ।
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान	प्रविधिको सही प्रयोग गरौं: लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरौं भन्ने नाराका साथ लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन भएको,
सामाजिक कुप्रथा न्यूनीकरण अभिमुखीकरण	- समाजमा व्याप्त बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो, बोक्सी र छाउपडी जस्ता कुप्रथा तथा अन्धविश्वास विरुद्ध ३ वटा मुख्य सचेतनामूलक क्रियाकलापहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरियो। - यस अभियान अन्तर्गत गंगादेव गाउँपालिका भित्रका ११ वटा माध्यमिक विद्यालयका छात्रछात्राहरू, पालिकाका सम्पूर्ण महिला आमा समूहहरू, समाजमा परम्परागत प्रभाव राख्ने धार्मिक गुरु, पुरोहित एवं धामीझाँक्रीहरूका साथै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र समुदायको नजिक रहेर काम गर्ने महिला

	स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई समेत प्रत्यक्ष सहभागी गराइयो ।
ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	• ८० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कम्बल वितरण गरियो । • समाज निर्माणमा ज्येष्ठ नागरिकहरूले पुर्‍याएको लामो अनुभव र योगदानको कदर गर्दै वडा स्तरमा सार्वजनिक सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।
सहायक सामग्री वितरण कार्यक्रम	• शारीरिक रूपमा असक्त र हिँडडुल गर्न कठिनाई भोगिरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान र मागको आधारमा आवश्यक सहायक सामग्रीहरू वितरण गरियो । • आवश्यकता अनुसार हिलचेयर, वैशाखी, सेतो छडी र श्रवण यन्त्र वितरण गरी परनिर्भरता न्यूनीकरण गरियो ।
शाखाको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्य	• शाखाको दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू तथा व्यवस्थापकीय कार्य

रोजगार सेवा केन्द्र

सि नं	आयोजना शिर्षक	वडा नं	रोजगारी संख्या	काम गरेको दिन	बिनियोजित बजेट	ज्याला रकम	अन्य खर्च

१	बल्लेजुर चौर घो.बा. सोलिड पि.सि.सी. तथा बाटो निर्माण	१	४	२८५	२७४०००	२१४८९०	५९९१०
२	ओइती शिवनगर बजार मेलडाँरी घो.बा. सोलिड पि.सि.सी. वाल तथा नाला निर्माण	१	४	२८४	२७००००	२१४१३६	५५७९९
३	खातिगाउँ मगरगाउँ घो.बा. मर्मत तथा निर्माण	१	३	२६५	२०००००	१९९८०	०
४	डाँडागाउँ विवाड भुर्ती मुलखोला मो.बा. मर्मत तथा निर्माण	१	४	२६५	२०००००	१९९८१०	०
५	पुर्णगाउँ सुखाओडार चौतारा बगेतरा घो .बा. मर्मत तथा निर्माण	२	३	२६५	२०००००	१९९८१०	०
६	रमाई घोरानेटी बडामेला मोटरबाटो सोलिड तथा मर्मत	२	३	२६५	२०००००	१९९८१०	०
७	फारुला भालुदारे गारापानी ढिटपिटखोला घरभिर घो मर्मत .बा. तथा निर्माण	२	४	२६६	२२५०००	२००५६४	२४५३१
८	ओईलाम रिमुलखोला घोरेटो बाटो तथा वाल निर्माण	२	३	१८०	२२५०००	१३५७२०	६९९४१


९	डाँडाखुटी खोर्याखोला मरठ अनमने हुँदै भालुखोलीसम्म गोरेटोबाटो निर्माण तथा मर्मत	३	४	२१२	१६००००	१५९८४८	
१०	गणेश आ वि स्कूल हुँदै बाँफुखोले मन्दिरसम्म सिँढी निर्माण	३	४	१९२	१८५०००	१४४७६८	३९९००
११	गतेरीदेखि कुरुरगारेको डाँडागाउँसम्म सिँढी निर्माण गंगादेव	३	४	१९७	१८५०००	१४८५३८	३६५७५
१२	गैरीखर्क घट्टेदेखि जहले, नाउली, खौउलाहुँदै ढोरेनी मोमर्मत .वा.	३	५	४२४	३२००००	३१९६९६	०
१३	तराघारी भिरपाखा खा पा निर्माण	४	४	९६	२०००००	७२३८४	१२७९१५
१४	खौला सिंचार डोप्टी पोखराडाँडा नाला जाली तथा ड्राईवाल तथा सोलिड निर्माण	४	८	७७१	७०००००	५८१३३४	११८५८१
१५	जग्र सेतिबुराँस सिम्टेखर्का फुलवास थारभिर आर सि सि पुल	५	३	२६५	५०००००	१९९८१०	३००५१०

१६	फालहालना पिठानचौर बस्नेउटा हात्तिदुंगा मसानघाट प्रतिकालय निर्माण	५	३	२५३	३५००००	१९०७६२	१५९६१४
१७	तिखिधुरी सिद्ध मन्दिर प्रयटकीय स्थल घेरवार वाल तथा फिल्ड निर्माण	६	४	३३१	२५००००	२४९५७४	०
१८	ताप्ला नेटापरी बल्ले छेरा हिले मोटरबाटो सोलिड तथा मर्मत	६	४	३९७	३०००००	२९९३३८	०
१९	खर्कडाँडा भेरिखर्क न्याउलेखा रातामाटा बल्ले पारनागा पोखरीजारु चौर गोमर्मत तथा निर्माण.बा.	६	४	३९७	३०००००	२९९३३८	०
२०	राँकडाँडा उपल्लो जाय घो.बा. पि.सि.सी. तथा वाल निर्माण	७	५	४४१	४०००००	३३२५१४	६७५०३
२१	जायचौर तिमिले धप्री घो.बा.तथा बाल निर्माण	७	३	१९८	३०००००	१४९२९२	०
२२	राँकमाधुरी गोरेटोबाटो तथा सिँढी निर्माण	७	३	२६५	२०००००	१९९८१०	
२३	तिमिले खानेपानी निर्माण तथा मर्मत	७	३	९१	१५००००	६८६१४	५३२३३
जम्मा			८९	६६५१	६१४४०००	५०१५३६१	६०९२०००

रोजगार सेवा केन्द्रले गरेका तथ्याङ्कगत विवरणहरु :

- वडा कार्यालयमार्फत चालु आ. व. २०८२/०८३ रोजगार कार्यक्रम तथा युवा रोजगारीका लागि रुपांतरण पहल आयोजना को लागि माग भएका विभिन्न २३ वटा आयोजनाहरु स्थानिय निर्देशक समितिको बैठकबाट पास गराई सो आयोजनाहरु EMIS software मा entry गरीयो र ति मध्ये २३ वटा आयोजनाहरु सम्झौता गरी आयोजना संचालन गरीएको छ । ति सबै २३ वटा आयोजनाको भुक्तानी भईसकेको छ । आगामी आ. व. २०८३/०८४ को लागि सात वटै वडा मार्फत बेरोजगार फाराम भर्नको लागि पत्राचार तथा आवश्यक सहजीकरण गरीयो ।
- बैदेशिक रोजगारमा जान चाहने ४० जना श्रमिकको श्रम स्वीकृतीको लागि फाराम भरी सहजीकरण गरीएको ।
- श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गरीयो ।
- बैदेशिक रोजगारमा गई श्रम स्वीकृतीको अवधिभरमा मृत्यु भएका श्रमिकको बिद्यालयमा अध्ययनरत भएका छोराछोरीको लागि बैदेशिक रोजगार सन्तती छात्रवृत्तिको लागि सातवटै वडामा सूचना जारी गरी प्राप्त बालबालिकाको छात्रवृत्तिको लागि बैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा पठाएको ।
- बैदेशिक रोजगारी मा जानुपूर्व र पश्चात भएगरेका समस्याहरु समाधानका लागि आवश्यक सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिएको ।
- बैदेशिक रोजगारीमा गई श्रम स्वीकृती बवधिभरमा मृत्यु भएका ३ जना श्रमिकको परीवारलाई बैदेशिक रोजगार बोर्ड बाट पाउने आर्थिक सहायताका लागि निवेदन पेश गर्न सहजीकरण गरी सत प्रतिशत आर्थिक सहायता प्राप्त गराईदिएको ।

स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धी विवरण (नक्सा)

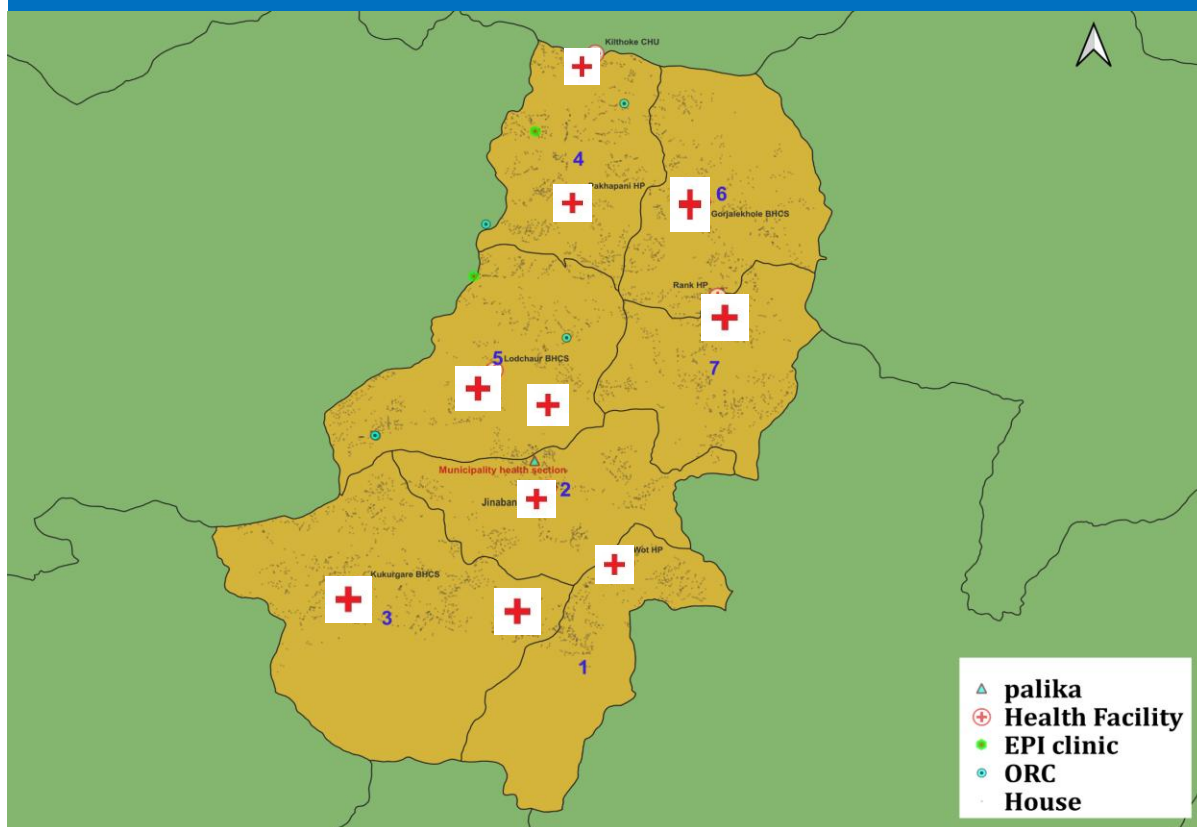


स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धी विवरण

बिबरण	संख्या
जम्मा वडा संख्या	७
सरकारी अस्पताल (स्थानीय तहबाट संचालित) /प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	०
सरकारी अस्पताल (संघीय तथा प्रादेशिक)	०
स्वास्थ्य चौकी	४
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र/शहरी स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई	३
गैर सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्था	०
गाउँघर क्लिनिक	१३
खोप क्लिनिक	१५
सुरक्षित प्रसुति केन्द्र	५
BEONC/CEONC	०
महिला स्वास्थ्य सेविका	३३
नागरिक आरोग्य केन्द्र	१


भौतिक तथा बित्तिय प्रगति

तह	कूल बजेट	भौतिक प्रगति प्रतिशत	बित्तिय प्रगति प्रतिशत
संघीय सशर्त अनुदान अन्तरगत	३०२०००००	८५ %	८९ %
प्रदेश अनुदान अन्तरगत	०	०	०
स्थानीय तह (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सँग सम्बन्धित)	१००००००	१०० %	१०० %
विशेष अनुदान/अन्य	२८४०००००	८१ %	६२ %
कूल जम्मा			

प्रतिवेदनको स्थिति (Reporting Status)




Immunization Coverage




IMNCI Programme

Incidence of Diarrhea per 1000 under five year children



8/5/2025


Incidence of Pneumonia per 1000 under five year children




14

IMNCI Programme


Percentage of children under five years with diarrhea treated with zinc and ORS



Percentage of children U5 years with Pneumonia treated with antibiotics (Amoxycillin)




मातृ तथा नवजात शिशु सेवाको प्रगतिको तुलनात्मक अवस्था



मातृ तथा नवजात शिशु सेवाको प्रगतिको तुलनात्मक अवस्था

Percentage of pregnancies terminated by induced procedure at health facility



उद्योग विकाश शाखा

- उद्यम विकास समिति गठन भएको ।
- गरिवी निवारणका लागि लागी लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मुल्याङ्कन समिति गठन भएको ।
- गरिवी निवारणका लागि लागी लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको लागी वडा वस्ती छनोट गरि कार्यक्रम भएको ।
- गरिवी निवारणका लागि लागी लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक परिचालन कार्यक्रम भएको ।
- गरिवी निवारणका लागि लागी लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यमशिलता तालिम/ कार्यक्रम भएको ।
- गरिवी निवारणका लागि लागी लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सिप विकास तालिम संचालन भएको ।
- गरिवी निवारणका लागि लागी लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रविधी हस्तान्तरण भएको ।
- गरिवी निवारणका लागि लागी लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्तरोन्नति सिप विकास तालिम भएको ।
- गरिवी निवारणका लागि लागी लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत उत्पादन उत्पादकत्व अभिवृद्धी का लागि समुहमा प्रविधी हस्तान्तरण भएको ।
- गरिवी निवारणका लागि लागी लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत गठन भएका समुहहरुको अनुगमन तथा बैठक सहजिकरण भएको ।
- गरिवी निवारणका लागि लागी लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यम विकास समितिको नियमित बैठक बसेको ।
- उद्यमिहरुको डाटा (GESIMIS) अध्याबधिक भएको ।

वडा गत प्रगति

वडा नं. ६ को कार्यालय

१. वडाको वार्षिक बजेट विवरण

- कुल विनियोजित बजेट : ८२ लाख ८७ हजार
- पुँजिगत तर्फ : ७५ लाख
- चालु तर्फ : ७ लाख ८७ हजार

२. विकास निर्माण कार्यक्रमको प्रगति

- जम्मा योजना : २२
- सम्पन्न योजना : २१
- सम्पन्न हुन नसेको योजना : १

३. सेवा प्रवाह

क) व्यक्तिगत घटना दर्ता

- जन्म दर्ता : १३९ (प्रतिलिपी करिव ५०)
- विवाह दर्ता : ५३ (प्रतिलिपी करिव ५)
- मृत्यु दर्ता : २१
- सम्बन्ध विच्छेदन दर्ता : ४
- वसाई सराई : ११ (गएको)

ख) समाजिक सुरक्षा

- जम्मा लाभग्राही सङ्ख्या : ६७०
- आ.व २०८२/०८३ मा थपिएका लाभग्राही : ६९
- अन्य जेष्ठ नागरिक : १६३ (जसमध्ये १६१ जना पुरानो र नया २ जना)
- जेष्ठ नागरिक दलित : ६ (जसमध्ये २ जना पुरानो र नया ४ जना)
- जेष्ठ नागरिक एकल महिला : १८ (जसमध्ये १७ जना पुरानो १ जना नया)
- असहायक एकल महिला (विधवा) : ५४ (जसमध्ये ५१ पुरानो र ३ जना नया)

- पुर्ण अशक्त अपाङ्ग : १
- अति कशक्त अपाङ्ग : ३२
- क्षेत्र तोकिएका बालबालिका : ३७८ (जसमध्ये ३२३ जना पुरानो ५५ जना नया)
- दलित बालबालिका : १८ (जसमध्ये १४ जना पुरानो ४ जना नया)

ग) सिफारिस

- नागरिकता/नागरिकता प्रतिलिपी सिफारिस : करिव २००
- अङ्ग्रेजी सिफारिस : ४०
- घरबाटो / चारकिल्ला प्रमाणित : ४७
- अन्य सिफारिस : ३६५

४. राजस्व संकलन

- जम्मा राजस्व संकलन : रु. २,८४,७८२.०८
- जसमा,
- भूमिकर/मालपोत कर : रु. १,१३,९२०.६३
- न्यायिक दस्तुर : रु. १,५००
- नक्सापार दस्तुर : रु. २,०००
- सिफारिस दस्तुर : रु. ३८,८२५
- व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर : रु. ८१,६००
- नाता प्रमाणित दस्तुर : रु. १६,६५०
- अन्य दस्तुर : रु. ३०,२८६.४५

५. अनुगमन तथा बैठक

- वडा समितिका बैठक सङ्ख्या : ३६
- योजना अनुगमन : २२

६. न्यायिक कार्यसम्पादन

- आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा वडा कार्यालयमा प्राप्त उजुरी तथा विवादहरूलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप र समन्वयको माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ। वडाबाट समाधान हुन नसकेका विषयहरू आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा पठाइएको छ।

- प्राप्त उजुरी : ६
- मेलमिलापबाट समाधान भएका : ३
- न्यायिक समितिलाई सिफारिस गरिएको : १
- प्रक्रियामा रहेका : २

७. पशु उपचार तथा पशु स्वास्थ्य सेवा

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा वडा नं. ६ अन्तर्गत पशुपालन व्यवसायलाई प्रवर्द्धन तथा पशु स्वास्थ्य सुधार गर्ने उद्देश्यले पशु उपचार तथा प्राविधिक सेवाहरू सञ्चालन गरिएको छ। पशु प्राविधिकको समन्वयमा बिरामी पशुहरूको उपचार, परामर्श तथा आवश्यक औषधि वितरणको कार्य सम्पन्न गरिएको छ।

- उपचार गरिएका पशु : करिव १२४७७
- उपचारबाट लाभान्वित किसान : करिव ९६५

८. प्रमुख उपलब्धिहरू

- स्वीकृत योजनाहरू समयमै सम्पन्न गरियो।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गरियो।
- व्यक्तिगत घटना दर्ता सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन गरियो।
- राजस्व संकलनमा सुधार गरियो।
- सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाइयो।
- वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सिफारिस तथा प्रमाणित सेवाहरू समयमै उपलब्ध गराइयो

वडा नं. ३ को कार्यालय

१. प्रमुख उपलब्धिहरू

वडा कार्यालयबाट नियमित सार्वजनिक प्रशासनिक सेवा प्रवाह

- जनमुखि तथा जनचाहाना बमोजिम सेवा प्रवाह भएको
- व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सेवाको प्रभावकारी सन्चालन
- व्यक्तिगत घटना दर्ताको लागि अनलाईन घटना दर्ता प्रारम्भ भएको
- जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरदैलोमा गई नविकरण गरेको

पुर्वाधार निर्माणमा आवश्यक समन्वयनको कार्य सन्चालन

- शिक्षा,स्वास्थ्य,कृषि,महिला,युवा,खेलकुद,जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता लक्षित कार्यक्रम सन्चालन
- विद्यालयमा जनप्रतिनिधि कार्यक्रम मार्फत प्रत्येक महिना शैक्षिक मेला सन्चालन
- समुदाय स्तरमा परिचलित भई स्वास्थ्य परामर्श सेवामा खतिने महिला स्वयम सेविकालाई प्रोत्साहन गर्न यातायात तथा सन्चार खर्चको व्यवस्थापन
- महिला तथा आमा समुहलाई महिला सन्जाल गठन गरि अभिमुखिकरण कार्य मार्फत सचेतना कार्य सन्चालन
- युवा लक्षित वडा अध्यक्ष कप तथा विविध कार्यक्रम सन्चालन
- राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड केन्द्रित खेलकुद कार्यक्रम मासिक रूपमा सन्चालन गरि खेलकुद कार्यक्रम सन्चालन गरको ।
- विद्यालयमा खेलकुद विकास कार्यक्रम मार्फत मार्सलआर्ट देलको विकास गरेको
- सरसफाई तथा वातावरण सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रम सन्चालन
- अव्यवस्थित बसोबासको ११४ वटा फारम संकलन गरि गंगापालिकाको प्रशासन शाखामा गठाएको
- राजस्व संकलन सम्बन्धी कार्य सन्चालन

३ पन्जिकरण सेवा

- जन्मदर्ता ५४ वटा
- मृत्युदर्ता २१ वटा
- विवाह दर्ता ४५ वटा
- सम्बन्धविच्छेद २ वटा
- बसाईसराई दर्ता २७ वटा
 - आएको ३
 - गएको २४

४ विकास निर्माण सम्बन्धि सेवा

- पुर्वाधार बिकास जम्मा १५ वटा योजना भुक्तानी भएको १४ वटा
- वडा कार्यालयको वजेट मार्फत ५ वटा ५ लाख को योजना सबै भुक्तानी
- कार्य सम्पन्न भएको योजना १०० प्रतिशत
- भुक्तानी भएको योजना ९३.३३ प्रतिशत
- भुक्तानी हुन नसक्नुको कारण खातामा पैसा नभएकाले
- कुनै पनि योजना रकमान्तर नभई योजना सम्पन्न भएको

५ सामाजिक विकास

- विद्यालयमा जनप्रतिनिधि कार्यक्रम मार्फत नियमित अनुगमन
- वडा शिक्षा समिति गठन गरि कार्य सन्चालन गरेको
- घरघरमा महिला स्वयंसेविका कार्यक्रम सन्चालन
- उष्कृष्ट शिक्षक, विद्यार्थीलाई सम्मान कार्यक्रम
- गंगादेव गाउँपालिका तथा आसपासका स्थानमा सन्चालन हुने विविध खेलकुद कार्यक्रममा महिला तथा पुरुष खेलाडी सहभागी गाराउँदै आएको

६ राजस्व संकलनको अवस्था

- अन्य दस्तुर ७,५००।—
- नाता प्रमाणित दस्तुर ३७,४००।—
- व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर २,१६,८००।—
- सिफारिस दस्तुर ६८,७५०।—
- भुमिकर/मालपोत १,१४,२७३.४१।—
- जम्मा ४,४४,७२३.४१।

७ नागरिकता सिफारिसको अवस्था

- जम्मा नागरिकता सिफारिस १८१
- अनलाइन नागरिकता सिफारिस ७५
- अफलाईन नागरिकता सिफारिस १०६
- अनलाइन नागरिकता सिफारिस सन्चालन मिति २०८२/०९/०८ गतेदेखि
