बडीमालिका नगरपालिका


बाजुरा, सुदूरपश्चिम प्रदेश, आ.व. २०८०/८१ देखि २०८२/८३

G E S I-C IP अनुगमन तथा बजेट विश्लेषणः पालिका विशेष संक्षिप्त जानकारी


एक नजरमा बडीमालिका

५	रु. १.७५ करोड	८५.५%	८०	० (०%)	३२ (४०%)	छैन
G E S I नीतिगत उद्देश्य	तीन वर्षको कुल G E S I विनियोजन	तीन वर्षको भारित औसत खर्च दर	कुल G E S I-C IP क्रियाकलाप	सम्पन्न क्रियाकलाप	सुरु नभएका क्रियाकलाप	G E S I मैत्री संरचनामा पूँजीगत लगानी

वर्षगत G E S I विनियोजन र खर्च (रु. लाखमा)

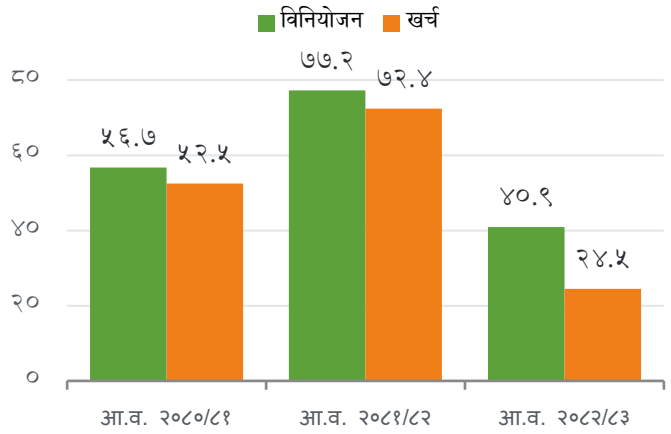

बजेट खर्च दर (%)

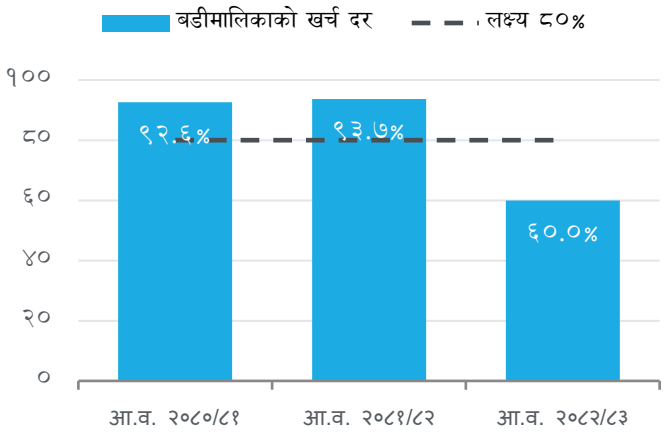

विनियोजनः G E S I तथा महिला र बालबालिका उपक्षेत्रमा स्वीकृत बजेट। **खर्चः** S u T R A मा अभिलेख भएको वास्तविक खर्च। **खर्च दर (बजेट विश्वसनीयता):** विनियोजित रकमको तुलनामा भएको खर्चको प्रतिशत। **लक्ष्यः** G E S I-C IP नतिजा ढाँचा अनुसार G E S I प्राथमिकताको बजेट कम्तीमा ८०% खर्च हुनुपर्ने।

मुख्य सन्देशहरू

विनियोजनमा कटौती। G E S I लक्षित विनियोजन आ.व. २०८०/८१ को रु. ५६.७ लाखबाट २०८१/८२ मा रु. ७७.२ लाख पुग्यो, तर २०८२/८३ मा ४७% घटेर रु. ४०.९ लाखमा झऱ्यो।

एउटा पनि क्रियाकलाप सम्पन्न छैन। ८० G E S I-C IP क्रियाकलापमध्ये ५८% चालु र ४०% सुरु नभएका छन्, तर एउटा पनि सम्पन्न भएको छैन। क्रियाकलाप सुरु हुन्छन् तर टुङ्गिँदैनन्।

पाँच नीतिगत उद्देश्य। G E S I-C IP ले सहभागिता, लैङ्गिक हिंसा अन्त्य र अपाङ्गता समावेशीकरण समेट्छ। बजेटको ३२.१% सुशासन र २१.४% महिला सशक्तीकरणमा छ।

खर्च दरमा तीव्र गिरावट। पहिलो दुई वर्ष ९२.६% र ९३.७% खर्च भएकोमा आ.व. २०८२/८३ मा खर्च दर ६०.०% मा झऱ्यो, अर्थात् एकै वर्षमा ३३.७ प्रतिशत बिन्दुले गिरावट।

लक्षित कार्यक्रममा शून्य खर्च। आ.व. २०८२/८३ मा छाउपडी तथा लैङ्गिक हिंसा उन्मूलन (रु. १ लाख), अपाङ्गता सीप विकास (रु. १ लाख) र दलित सशक्तीकरण (रु. ३ लाख) मा खर्च शून्य रह्यो।


G E S I समिति गठन हुन बाँकी। नगरपालिकामा G E S I समिति अझै गठन नहुँदा G E S I मैत्री योजना, बजेट र अनुगमन संस्थागत हुन सकेको छैन।

यो संक्षिप्त जानकारी बडीमालिका नगरपालिका, बाजुरामा गरिएको G E S I-C IP अनुगमन तथा बजेट विश्लेषणमा आधारित छ। पालिकाले E W P N कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०८१/८२ मा G E S I-C IP तयार गरेको थियो। विश्लेषणमा आ.व. २०८०/८१ देखि २०८२/८३ को बजेट विनियोजन र खर्च (S u T R A सँग भिडाइएको), संयुक्त G E S I-C IP अनुगमन workbook, G E S I सम्पर्क व्यक्तिसँग अन्तर्वार्ता, समूह छलफल तथा नगरपालिका भवनको भौतिक परीक्षण समावेश छ।

G E S I-C IP : कार्यान्वयन, चुनौती र आगामी बाटो

G E S I-C IP क्रियाकलापको कार्यान्वयन स्थिति


कुल ८० क्रियाकलाप, प्रत्येक थोप्लाले एउटा क्रियाकलाप जनाउँछ



- चालु ४६ (५८%)
- सुरु नभएको ३२ (४०%)
- सम्पन्न ० (०%)
- रद्द वा ढिलाइ २ (३%)

बडीमालिकाको G E S I बजेटः विषयगत बाँडफाँट

आ.व. २०८०/८१ देखि २०८२/८३ को कुल विनियोजनमा हिस्सा (%)

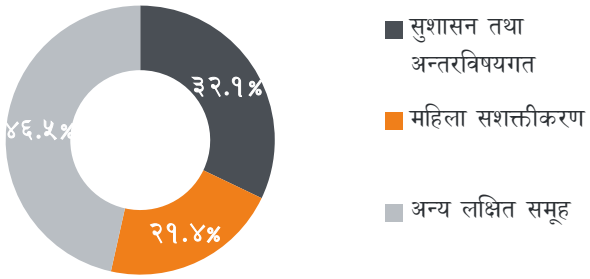

बजेटको एक तिहाइ सुशासन र एक पाँचौं भाग महिला सशक्तीकरणमा छ। लैङ्गिक हिंसा, अपाङ्गता र दलित लक्षित शीर्षकमा आ.व. २०८२/८३ मा खर्च शून्य रह्यो।

वर्षगत G E S I बजेट विवरण

आर्थिक वर्ष	विनियोजन (रु.)	खर्च (रु.)	खर्च दर (%)
आ.व. २०८०/८१	५६,६६,४००	५२,४६,९७४	९२.६
आ.व. २०८१/८२	७७,२२,०००	७२,३७,३७१	९३.७
आ.व. २०८२/८३	४०,९१,०००	२४,५४,७४०	६०.०
जम्मा (३ वर्ष)	**१,७४,७९,४००**	**१,४९,३९,०८५**	**८५.५**

रु. २५.४० लाख (१४.५%) तीन वर्षमा विनियोजित G E S I रकममध्ये खर्च हुन नसकेको रकम

स्रोतः G E S I तथा महिला र बालबालिका उपक्षेत्रको बजेट अभिलेख, S u T R A सँग भिडाइएको।

मुख्य चुनौतीहरू

- दुई वर्षको राम्रो खर्चपछि आ.व. २०८२/८३ मा खर्च दर तीव्र रूपमा घटेको।
- क्रियाकलाप सुरु हुन्छन् तर सम्पन्न हुँदैनन्, सम्पन्न क्रियाकलाप शून्य।
- लैङ्गिक हिंसा, अपाङ्गता र दलित लक्षित कार्यक्रममा बजेट भएर पनि खर्च शून्य।
- वडास्तरको प्रशासनिक क्षमता कमजोर हुँदा खर्च र कार्यान्वयनमा ढिलाइ।

संस्थागत अवस्था

- G E S I समिति अझै गठन भएको छैन।
- G E S I सम्पर्क व्यक्तिको कार्यविवरण औपचारिक रूपमा तोकिएको छैन।

सिफारिसहरू

- शून्य खर्च भएका छाउपडी तथा लैङ्गिक हिंसा उन्मूलन, अपाङ्गता सीप विकास र दलित सशक्तीकरण कार्यक्रमको तुरुन्त समीक्षा गर्ने।
- G E S I मैत्री योजना, बजेट र अनुगमनलाई संस्थागत गर्न नगरपालिकामा G E S I समिति यथाशीघ्र गठन गर्ने।
- शून्य खर्च भएका प्रत्येक कार्यक्रमका लागि जिम्मेवार व्यक्ति तोकी निश्चित समयभित्र खर्च वा औपचारिक रकमान्तर गर्ने।
- खर्चमा ढिलाइको कारण पत्ता लगाउन वडास्तरको प्रशासनिक क्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने।
- चालु रहेका सबै कार्यक्रमको द्रुत कार्यान्वयन परीक्षण गरी सम्पन्न हुन नसक्नुका अवरोध पहिचान गर्ने।
- अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा र त्रैमासिक खर्च अनुगमन संस्थागत गर्ने।
- आ.व. २०८३/८४ मा नयाँ प्रतिबद्धता थप्नुअघि चालु क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने प्राथमिकता तोक्ने।
- G E S I समितिको बैठक, निर्णय र लाभान्वित समूहको खण्डीकृत विवरण अनुगमन w o r k b o o k मा थप्ने।

तथ्याङ्कको स्रोतः G E S I-C IP अनुगमन तथा बजेट विश्लेषण प्रतिवेदन (S P C S N लाई पेश गरिएको) र सोको प्रस्तुतीकरण, बडीमालिका नगरपालिकाको बजेट अभिलेख, S u T R A विवरण, G E S I सम्पर्क व्यक्तिसँगको अन्तर्वार्ता, समूह छलफल तथा भौतिक परीक्षण। आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत बजेट (रातो किताब) यस विश्लेषणमा समावेश छैन। अर्को अनुगमन चक्रमा समावेश गरिनेछ।
